



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ**



PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
(PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020)**

**TERESINA
2021**

I - RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Gildásio Guedes Fernandes
Reitor

Viriato Campelo
Vice-Reitor

Ana Beatriz Sousa Gomes
Pró-reitora de Ensino de Graduação

Deborah Dettmam Matos
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura

Evangelina da Silva Sousa
Pró-reitora de Administração

Luiz de Sousa Santos Junior
Pró-reitor de Pesquisa e Inovação

Luís Carlos Sales
Pró-reitor de Planejamento e Orçamento

Regilda Saraiva Dos Reis Moreira Araujo
Pró-reitora de Ensino de Pós-Graduação

Willams Costa Neves
Pró-reitor de Assuntos Estudantis e Comunitários

II. RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA UNIDADE

Quadro 1. Informações dos Dirigentes da PREUNI

Unidade / Subunidade	Função do Dirigente	Nome	E-mail/fone institucionais
Prefeitura Universitária	Prefeito	Alessandro Rhadamek Alves Pereira	preuni@ufpi.edu.br (86) 3215-5604
Coordenadoria de Planejamento e Controle	Coordenador	Marco Antônio Mastrangelo	controlecpc@ufpi.edu.br (86) 3215-5605
Coordenadoria de Projetos	Coordenador	Érica Cecília de Sousa Soares	preuni.projeto@ufpi.edu.br (86) 3215-5607
Coordenadoria de Obras e Serviços	Coordenador	Luis Gustavo Mota Souza	cos.preuni@ufpi.edu.br (86) 3237-2207
Coordenadoria de Serviços Operacionais	Coordenador	Washington Luis Menezes Moura	preuni.operacional@ufpi.edu.br (86) 3215-5610
Coordenadoria de Manutenção Patrimonial	Coordenador	Pedro José Gomes Rodrigues	preuni.manutenção@ufpi.edu.br (86) 3215-5609
Divisão de Arquitetura	Chefe de divisão	Evandro Cronemberger Brito	divisãodearquitetura@ufpi.edu.br (86) 3215-5607
Divisão de Fiscalização	Chefe de divisão		preuni.obras@ufpi.edu.br (86) 3237-2207
Divisão de Gestão Ambiental	Chefe de divisão	Agenor Francisco Rocha Junior	preuni.operacional@ufpi.edu.br (86) 3215-5610
Divisão de Transportes	Chefe de divisão	Sebastiao Lopes Da Silva	transportes@ufpi.edu.br (86) 3215-5610
Divisão Vigilância	Chefe de divisão		vigilancia@ufpi.edu.br (86) 3215-5551
Divisão de Infraestrutura	Chefe de divisão	Frederico Ribeiro Gonçalves Vasconcelos Rosendo	preuni.manutencao@ufpi.edu.br (86) 3215-5609
Divisão de Manutenção Predial	Chefe de divisão	José Antônio Ramos Da Costa Filho	preuni.manutencao@ufpi.edu.br (86) 3215-5609

III. MENSAGEM DO DIRIGENTE DA UNIDADE



*Prof. Dr. Alessandro Rhadamek
Prefeito Universitário*

É com satisfação que a Prefeitura Universitária (PREUNI), da Universidade Federal do Piauí (UFPI), apresenta o Relatório de Atividades, referente ao exercício de 2020, elaborado por meio de seus servidores e de acordo com a nova abordagem estabelecida pela Diretoria de Gestão de Governança (DGOV), vinculada à Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento (PROPLAN). Todos os dados apresentados nesta prestação de contas são resultantes de uma ação participativa de todos os setores da PREUNI, sendo que este dirigente assegura a integridade das informações contidas neste relatório.

A PREUNI a fim de cumprir sua missão, sempre respaldada nos seus valores e comprometida com a excelência, adotou ações que contribuiriam para a melhoria contínua e bem-estar de toda comunidade da UFPI. Ressalta-se que o acompanhamento do planejamento da PREUNI seguiu as metas estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Institucional, quadriênio 2020-2024, e no Plano de Desenvolvimento da Unidade, biênio 2020-2022.

A entrada em vigor do Decreto Legislativo Nº 6, de 20 de março de 2020, que reconheceu a ocorrência do estado de calamidade pública em virtude da pandemia de coronavírus, impossibilitou ou limitou a realização de diversas atividades e que o planejamento para o ano de 2020 teve que ser reformulado para atendimento das demandas oriundas da pandemia COVID-19. Entretanto, mesmo com estas restrições, a PREUNI conseguiu obter um bom desempenho com um grau de eficácia de 66% nos resultados alcançados, atingindo 27 metas de uma total de 41 metas planejadas, os quais abordaram os seguintes temas estratégicos: Gestão e governança; Sustentabilidade; Tecnologia e informação; Infraestrutura; Assistência estudantil; e Contexto da Pandemia COVID-19.

Finalizando, observou-se que mesmo diante de condições complexas e restrições orçamentárias os avanços foram constantes e o planejamento da PREUNI para o ano de 2021 seguirá contando com o comprometimento do Prefeito Universitário, Coordenadores, Chefes de Divisão e demais servidores efetivos e terceirizados.

IV - SUMÁRIO

I - RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR	2
II. RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA UNIDADE	3
III. MENSAGEM DO DIRIGENTE DA UNIDADE	4
IV - SUMÁRIO	5
V - LISTAS DE FIGURAS/QUADROS/TABELAS	6
VI - INTRODUÇÃO	7
VII - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	11
VIII - ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO DA UNIDADE (CONFORME PDI 2020-2024 e o PDU 2020-2022)	12
IX - A AVALIAÇÃO GERAL DA UNIDADE ACERCA DOS RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2020	31
X - PLANEJAMENTO DA PREUNI PARA 2021	33
XI – DADOS ESPECÍFICOS DA UNIDADE	37
XII - ANEXOS	53
ANEXO I - RELAÇÃO DE PROJETOS MOVIMENTADOS EM 2020	54
ANEXO II - ATIVIDADES COMPLEMENTARES EM 2020	58
ANEXO III - TOTAL GASTO COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART/RRT) EM 2020	59
ANEXO IV – LICITAÇÕES CONCLUÍDAS EM 2020	64
ANEXO V – OBRAS EM ANDAMENTO EM 2020	65
ANEXO VI – NÚMERO DE ATENDIMENTOS DE MANUTENÇÃO ATENDIDOS EM 2020	68
ANEXO VII – SERVIÇOS E CONTRATOS DE MANUTENÇÃO GERIDOS EM 2020	71
ANEXO VIII – RELAÇÃO DE POSTOS EFETIVOS E TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA NA UFPI EM 2020	72
ANEXO IX – BOLETINS DE OCORRÊNCIA EM 2020	74
ANEXO X – CONTRATOS REFERENTES A COLETA DE RESÍDUOS	75

V - LISTA DE FIGURAS/QUADROS/TABELAS

Figura 1. Cadeia de Valor da PREUNI.....	9
Figura 2. Mapa Estratégico da PREUNI.....	10
Figura 3. Organograma hierárquico da PREUNI.....	11
Quadro 1. Informações dos Dirigentes da PREUNI	3
Quadro 2. Painel de Acompanhamento do Plano de Metas 2020.....	12
Quadro 3. Ações realizadas pela PREUNI no âmbito da pandemia COVID-19.	30
Quadro 4. Objetivos e metas gerais do PDU para o ano de 2021.....	33
Quadro 5. Quantitativo de serviços e obras de engenharia e arquitetura por situação (2020).....	39
Quadro 6. Serviços de engenharia e arquitetura (2020)	40
Quadro 7. Estrutura de Acessibilidade Arquitetônica ou Física por Campus e Centro (2020)	42
Quadro 8. Obras e Serviços de Engenharia (2020).	44
Quadro 9. Justificativas dos investimentos.....	47
Quadro 10. Contrato de locação de equipamentos em 2020.	49
Tabela 1. Detalhamento da área física da UFPI (2020).	37
Tabela 2. Evolução de área construída da UFPI (2014-2020).	38
Tabela 3. Desfazimento de bens.....	48
Tabela 4. Consumo de energia elétrica e água em 2020.....	51

VI - INTRODUÇÃO

O primeiro órgão de planejamento físico da Universidade Federal do Piauí foi a Assessoria para Assuntos de Arquitetura e Urbanismo, criado em junho de 1971. Em 1972 lhe foi dada a denominação de Assessoria Técnica de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo - ATEAU. Naquele mesmo ano foi transformada em Coordenação de Planejamento Físico - COPLAF. Posteriormente, em 1974, foi denominada Coordenação de Estudos e Projetos de Obras. Finalmente em 1977 a Coordenação de Estudos e Projetos de Obras foi transformada em Diretoria de Projetos e Obras - DIPRO e em 2008 em Prefeitura Universitária - PREUNI, sendo regulamentada em 2015, por meio da Resolução nº 013/2015 do CONSUN, processo nº 23111.031961/2014-18.

A PREUNI é órgão suplementar da Universidade Federal do Piauí, subordinado à Reitoria, encarregado da administração da infraestrutura (projetos, obras e serviços de engenharia, espaço físico, manutenção predial e urbana) e serviços de apoio logístico e operacional (limpeza e conservação, gestão ambiental, segurança e transportes) dos Campi, executando serviços que possibilitam à instituição o desenvolvimento das atividades administrativas, de ensino, pesquisa e extensão.

MISSÃO

A Prefeitura Universitária (PREUNI) é um órgão da Universidade Federal do Piauí que tem como missão: Promover ações do planejamento estratégico, gerenciamento e controle da infraestrutura física, do apoio logístico e operacional da UFPI, de forma sustentável, integrada com a comunidade acadêmica, em prol da melhoria contínua e bem-estar de todos.

VISÃO

Ser reconhecida, até 2022, pela excelência de suas atividades para melhoria contínua de suas ações, pautadas na legalidade, ética e transparência, por meio de práticas que promovam a utilização eficiente e sustentável dos recursos institucionais.

VALORES

1 Eficiência: realização do trabalho buscando a utilização dos recursos da melhor forma para a obtenção de bons resultados;


2 Ética: agir sempre em observância aos princípios da honestidade, integridade, moralidade e coerência;

3 Impessoalidade: agir com a finalidade de atender o estrito interesse público;

4 Legalidade: atendimento e obediência à lei nas orientações e atos;


5 Transparência: agir de forma transparente, promovendo acesso às informações de interesse público, de forma clara, contribuindo para a realização de uma boa gestão

Figura 1. Cadeia de Valor da PREUNI.

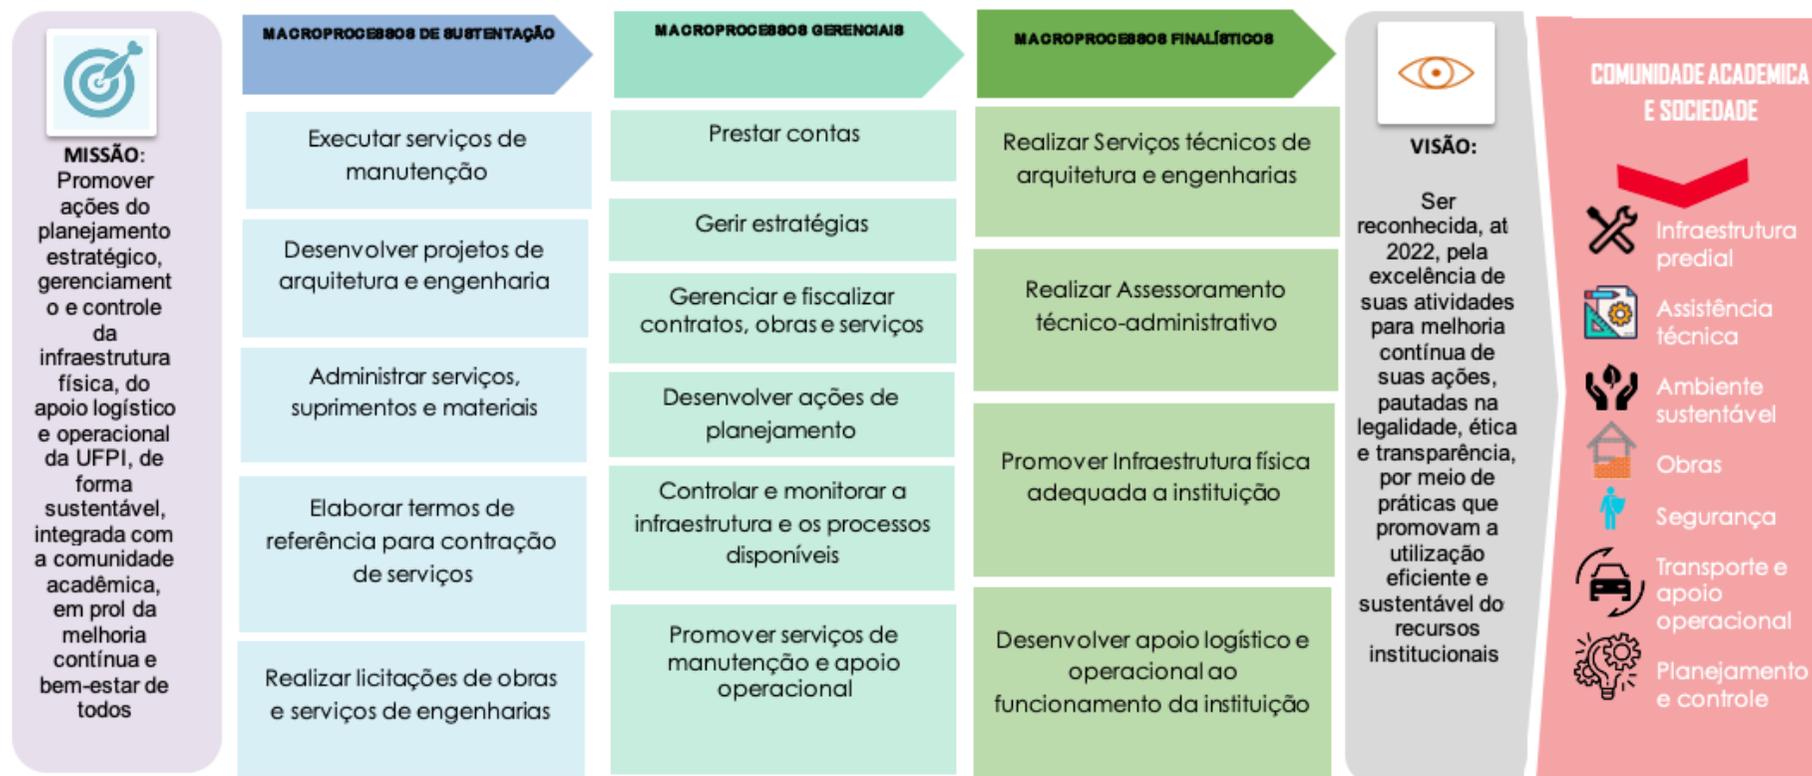

Fonte: PDU PREUNI, 2020.


Figura 2. Mapa Estratégico da PREUNI.



Fonte: PDU PREUNI, 2020.

VII - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Figura 3. Organograma hierárquico da PREUNI.

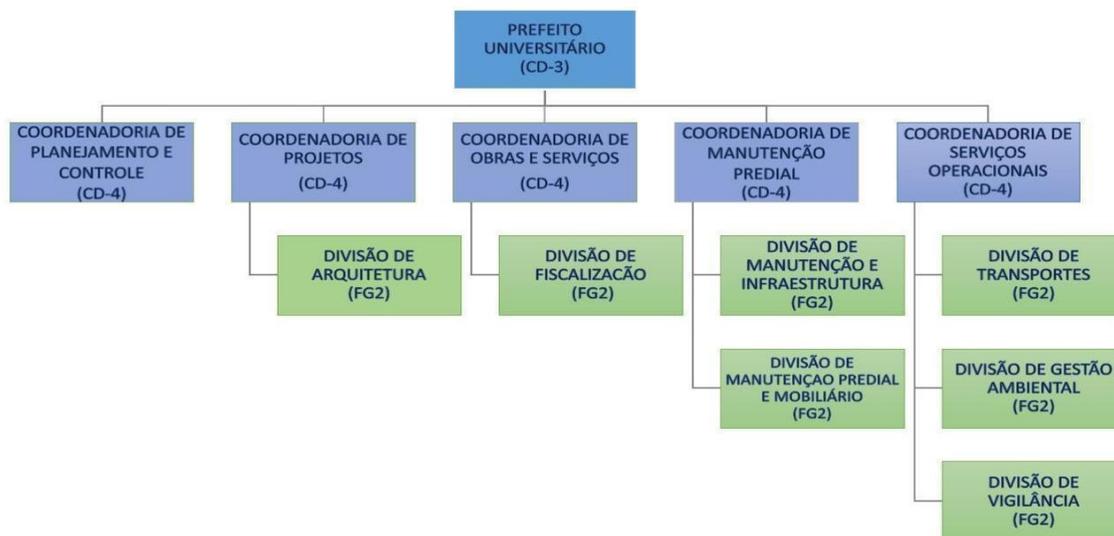

Fonte: PDU PREUNI, 2020.

VIII - ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO DA UNIDADE (CONFORME PDI 2020-2024 e o PDU 2020-2022)

Quadro 2. Painel de Acompanhamento do Plano de Metas 2020.

PAINEL DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE METAS 2020					
UNIDADE			PREUNI		
4	TEMA ESTRATÉGICO		GESTÃO E GOVERNANÇA		
OBJETIVO		Prover uma gestão moderna, eficiente, transparente e desburocratizada			
Item	Cenário em 2019	Meta 2020	Concluído (Sim/ Não)	Evidenciar (indicadores, links de editais, motivos de não conclusão)	Grau de Eficácia (realizado/planejado (Proporcional))
4.2.1	0	Elaborar plano anual de aquisição e compra de bens e serviços, conforme específico no PDI/PDU	Sim	Elaborado e publicado no PDU da PREUNI 2020-2022. https://ufpi.br/pdu-2020-2022-preuni	100%

4		TEMA ESTRATÉGICO		GESTÃO E GOVERNANÇA		
OBJETIVO		Fortalecer as boas práticas de governança, transparência da informação e gestão orientado a resultado				
Item	Cenário em 2019	Meta 2020	Concluído (Sim/ Não)	Evidenciar (indicadores, links de editais, motivos de não conclusão)	Grau de Eficácia (realizado/planejado (Proporcional))	
4.5.1	0	Identificar e mapear na PREUNI no mínimo 10 macroprocessos	Não	O estado de calamidade pública decretado em virtude da pandemia COVID 19 impossibilitou a realização desta atividade visto que o planejamento 2020 teve que ser reformulado para atendimento das demandas oriundas da pandemia. Esta meta será trabalhada no Plano Operacional da PREUNI de 2021.	0%	
4.5.3	0	Consolidar o novo Regimento Interno até 2020, e demais normativos até 2023	Não	O Regimento interno não foi encaminhado para apreciação pelo CONSUN em virtude de expectativa de alteração do mesmo com a mudança de gestão. Esta meta será trabalhada no Plano Operacional da PREUNI de 2021.	0%	
4.5.4	Não Existe	Elaborar o PDU até 2020	Sim	Elaborado e publicado. https://ufpi.br/pdu-2020-2022-preuni	100%	
4.5.5	Não Existe	Definir em cada Unidade Hierárquica seu Mapa Estratégico	Sim	Elaborado e publicado no PDU da PREUNI. https://ufpi.br/pdu-2020-2022-preuni	100%	
4.5.6	Não Existe	Definir cadeia de valor	Sim	Elaborado e publicado no PDU da PREUNI. https://ufpi.br/pdu-2020-2022-preuni	100%	

4		TEMA ESTRATÉGICO		GESTÃO E GOVERNANÇA		
OBJETIVO		Fortalecer as boas práticas de governança, transparência da informação e gestão orientado a resultado				
Item	Cenário em 2019	Meta 2020	Concluído (Sim/ Não)	Evidenciar (indicadores, links de editais, motivos de não conclusão)		Grau de Eficácia (realizado/planejado (Proporcional))
4.5.7	Não Existe	Estimular em 100% das unidades hierárquicas a adoção de práticas e ferramentas de Gestão de Projetos no planejamento e execução das atividades da unidade	Sim	<p>Meta 2020 - 10% (PREUNI)</p> <p>A Prefeitura Universitária adota a ferramenta de Gestão de Projetos Trello no planejamento e execução das atividades da unidade junto aos Coordenadores.</p>		100%
4.5.9	Não Existe	Possuir página eletrônica e realizar atualizações frequentes (no mínimo uma vez por mês) e ter aba específica para acompanhamento do PDI e PDU	Sim	<p>A página da PREUNI é atualizada mensalmente e possui aba específica para acompanhamento do PDU.</p> <p>https://ufpi.br/pdu-2020-2022-preuni</p> <p>O PDI pode ser acompanhado na página da PROPLAN</p> <p>https://proplan.ufpi.br/index.php/component/content/article?id=108</p>		100%

6		TEMA ESTRATÉGICO		SUSTENTABILIDADE		
OBJETIVO		Acompanhar, publicar e atualizar o plano de sustentabilidade da UFPI				
Item	Cenário em 2019	Meta 2020	Concluído (Sim/ Não)	Evidenciar (indicadores, links de editais, motivos de não conclusão)		Grau de Eficácia (realizado/planejado (Proporcional))
6.1.4	Não há divulgação	Acompanhar a execução dos eixos de responsabilidade da PREUNI definidos no Plano de Logística Sustentável	Não	<p>Meta 2020 - Divulgação das ações</p> <p>O estado de calamidade pública decretado em virtude da pandemia COVID 19 impossibilitou a conclusão desta atividade, visto que o planejamento 2020 teve que ser reformulado para atendimento das demandas oriundas da pandemia.</p> <p>Dessa forma, não houve tempo hábil para consolidar e divulgar as ações referentes aos eixos atribuídos à PREUNI. Esta meta será trabalhada no Plano Operacional da PREUNI de 2021.</p>		50%
6.1.2	Não há acompanhamento	Escrever projeto para acompanhar a execução do plano de logística sustentável da UFPI pelas unidades	Sim	<p>Meta2020 - Escrever projeto (CPC)</p> <p>O projeto de acompanhamento dos eixos de responsabilidade da PREUNI foi elaborado e publicado no site da PREUNI.</p> <p>https://ufpi.br/pls-2018-2020-preuni</p>		100%

7	TEMA ESTRATÉGICO		TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO			
OBJETIVO		Promover gestão de tecnologia da informação e dinamizar a comunicação interna e externa				
Item	Cenário em 2019	Meta 2020	Concluído (Sim/ Não)	Evidenciar (indicadores, links de editais, motivos de não conclusão)		Grau de Eficácia (realizado/planejado (Proporcional))
7.2.1	-	Implantar soluções de TI para atender 75% da demanda da PREUNI de informatização de suas atividades	Sim	O levantamento das necessidades foi elaborado e consta no PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES (PAC) DE BENS, SERVIÇOS E TIC inserido no PDU da PREUNI. https://ufpi.br/pdu-2020-2022-preuni		100%

9	TEMA ESTRATÉGICO		INFRAESTRUTURA			
OBJETIVO		Prover e gerir os projetos de ampliação de área construída da UFPI				
Item	Cenário em 2019	Meta 2020	Concluído (Sim/ Não)	Evidenciar (indicadores, links de editais, motivos de não conclusão)		Grau de Eficácia (realizado/planejado (Proporcional))
9.1.1	0%	Prover e gerir 40% dos projetos de edificações, reformas, adaptações e ampliações da UFPI até 2024	Sim	<p>Meta 2020 - 15% (CP)</p> <p>No ano de 2020 haviam 45 processos para serem geridos na Coordenação de Projetos, tendo sido finalizados 19 e em elaboração 26 processos.</p> <p>Anexo I, II e III.</p>		100%
9.1.2	0%	Prover e gerir 100% da contratação / licitação de obras e serviços de engenharia de interesse da UFPI, de acordo com a demanda durante os exercícios de 2020-2024	Sim	<p>Meta 2020 - 100% (CLOS e COS)</p> <p>Foram licitados e contratados todos os projetos concluídos e aprovados pela Administração Superior em 2020.</p> <p>Vide Anexo IV e V.</p>		100%
9.1.3	30%	Prover 75% da manutenção predial das edificações da UFPI até 2024	Sim	<p>Meta 2020 - 35% (CMP)</p> <p>O Anexo VI apresenta o número de atendimentos realizados pela Coordenação de Manutenção Patrimonial em 2020.</p>		100%

9		TEMA ESTRATÉGICO	INFRAESTRUTURA			
OBJETIVO		Prover e gerir os projetos de ampliação de área construída da UFPI				
Item	Cenário em 2019	Meta 2020	Concluído (Sim/ Não)	Evidenciar (indicadores, links de editais, motivos de não conclusão)		Grau de Eficácia (realizado/planejado (Proporcional))
9.1.4	30%	Gerir 100% da manutenção predial das edificações da UFPI até 2024	Sim	Meta 2020 - 35% (CMP) Os serviços de manutenção passaram a ser geridos de forma online por meio da ferramenta SINAPSE. Ver link https://sinapse.ufpi.br/saps/default.jsp E são geridos por meio dos contratos constante no Anexo VII.		100%
9.1.6	0%	Implantar a infraestrutura física definitiva da PREUNI, em uma única sede, até 2024	Sim	Meta 2020 - 5% (CP, CLOS e COS) Foi concluído o programa de necessidades e elaborado um estudo preliminar do projeto de construção da sede da PREUNI.		100%

9	TEMA ESTRATÉGICO		INFRAESTRUTURA		
OBJETIVO		Prover e gerir a gestão ambiental e segurança da UFPI			
Item	Cenário em 2019	Meta 2020	Concluído (Sim/ Não)	Evidenciar (indicadores, links de editais, motivos de não conclusão)	Grau de Eficácia (realizado/planejado (Proporcional))
9.2.1	0%	Melhorar em 10% a segurança pessoal e patrimonial da UFPI até 2024	Sim	<p>Meta 2020 - 1% (PREUNI)</p> <p>Para melhorar em 10% a segurança pessoal foram realizados:</p> <p>Aquisição de rádios para o grupo de vigilantes efetivos por meio do processo 23111.039361/2020-48;</p> <p>Abertura de processo para aquisição de coletes balísticos, algemas, fardamentos e outros equipamentos para uso da Divisão de Vigilância (23111.026693/2020-62);</p> <p>Contratação de novos postos e rondas por meio dos Contratos Nº 16/2020 e Nº 17/2020;</p> <p>Inserção dos serviços da Vigilância no EFUPI;</p> <p>Elaboração de Cartilha com orientações de segurança e publicização no site https://www.ufpi.br/preuni</p> <p>O anexo VIII apresenta a relação de postos efetivos e terceirizados de vigilantes na UFPI em 2020.</p> <p>O anexo IX apresenta o número de Boletins de ocorrência em 2020.</p>	100%
9.2.2	Não há projeto	Implantar projeto/programa de gestão ambiental da UFPI até 2024	Não	<p>META 2020 - Levantamento das demandas (CSO)</p> <p>Foi realizado o levantamento de demandas de forma parcial, entre elas a necessidade de regularizar a coleta de resíduos comuns, especiais e recicláveis da UFPI.</p> <p>O anexo X apresenta os contratos geridos e seus respectivos objetos.</p> <p>No entanto, em virtude da pandemia houve dificuldade de concluir o levantamento de demandas necessárias para implantar projeto/programa de gestão ambiental da UFPI até 2024. A previsão é de que essa meta seja alcançada em 2021.</p>	20%

9	TEMA ESTRATÉGICO		INFRAESTRUTURA			
OBJETIVO		Prover e gerir a gestão ambiental e segurança da UFPI				
Item	Cenário em 2019	Meta 2020	Concluído (Sim/ Não)	Evidenciar (indicadores, links de editais, motivos de não conclusão)		Grau de Eficácia (realizado/planejado (Proporcional))
9.2.3	20%	Adaptar e regularizar 100% das edificações existentes para as normas de combate a incêndio e pânico nos Campi	Não	<p>META 2020 -20% (CP, CPC, CMP E COS)</p> <p>A PREUNI não possui quadro técnico suficiente para atender a demanda e pretende contratar empresa qualificada para atendimento parcial da demanda em 2022.</p>		0%
9.2.4	Não há sistema contra incêndio	Implantar sistema contra incêndio na BCCB	Sim	<p>META 2020 - Elaborar demanda (CP, CLOS E COS)</p> <p>A PREUNI elaborou projeto de Combate a Incêndio do espaço de convivência e BCCB e submeteu ao Corpo de Bombeiros para análise. Processo 23111.073956/2019-96.</p>		100%

9		TEMA ESTRATÉGICO		INFRAESTRUTURA		
OBJETIVO		Desenvolver, implantar e executar projeto institucional de eficiência energética				
Item	Cenário em 2019	Meta 2020	Concluído (Sim/ Não)	Evidenciar (indicadores, links de editais, motivos de não conclusão)		Grau de Eficácia (realizado/planejado (Proporcional))
9.3.1	não há	Elaborar, executar e acompanhar projeto de eficiência energética	Não	Meta 2020 - levantamento das unidades (CP, CMP E COS) A Meta está prevista no Plano de Logística Sustentável – PLS (2018-2020), no eixo 2 de EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, e tem como setores responsáveis a CICE, CMP/PREUNI E DIRETORES. A atribuição da PREUNI seria repassar as informações necessárias à CICE para elaboração dos projetos, no entanto, em 2020 nada foi requisitado.		0%

9		TEMA ESTRATÉGICO		INFRAESTRUTURA		
OBJETIVO		Projetar infraestrutura predial e viária voltada à acessibilidade				
Item	Cenário em 2019	Meta 2020	Concluído (Sim/ Não)	Evidenciar (indicadores, links de editais, motivos de não conclusão)		Grau de Eficácia (realizado/planejado (Proporcional))
9.4.1	10%	Projetar infraestrutura predial voltada à acessibilidade de 50% das edificações da UFPI até 2024	Não	Meta 2020 - 15% (CP) Em 2020, após a contratação de novos servidores, foi possível destacar uma equipe para elaboração de laudos de acessibilidade dos prédios da UFPI conforme Portaria Interministerial nº 323, de 10 de setembro de 2020 (Ministério de Estado da Economia e do Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos).		0%

9		TEMA ESTRATÉGICO		INFRAESTRUTURA		
OBJETIVO		Projetar infraestrutura predial e viária voltada à acessibilidade				
Item	Cenário em 2019	Meta 2020	Concluído (Sim/ Não)	Evidenciar (indicadores, links de editais, motivos de não conclusão)		Grau de Eficácia (realizado/planejado (Proporcional))
9.4.2	5%	Projetar infraestrutura viária (incluindo calçadas) voltada à acessibilidade de 20% das instalações da UFPI até 2024	Não	<p>Meta 2020 - 5% (CP)</p> <p>Em 2020, após a contratação de novos servidores, foi possível destacar uma equipe para elaboração de laudos de acessibilidade dos prédios da UFPI conforme Portaria Interministerial nº 323, de 10 de setembro de 2020 (Ministério de Estado da Economia e do Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos).</p>		0%
9.4.3	25%	Manter infraestrutura predial voltada à acessibilidade de todas as edificações da UFPI	Sim	<p>Meta 2020 - 10% (CMP)</p> <p>A infraestrutura predial voltada a acessibilidade existente na UFPI está sendo mantida por meio do Contrato nº 61/2019 com objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA. CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELA E UNIDADES EXTERNAS (CCS E CEAD) TERESINA -PI.</p>		100%
9.4.4	0%	Manter infraestrutura viária (incluindo calçadas) voltada à acessibilidade de 50% das instalações da UFPI	Sim	<p>Meta 2020 - 10% (CMP)</p> <p>A infraestrutura viária voltada a acessibilidade existente na UFPI está sendo mantida por meio do Contrato nº 61/2019 com objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA. CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELA E UNIDADES EXTERNAS (CCS E CEAD) TERESINA -PI.</p>		100%

9		TEMA ESTRATÉGICO		INFRAESTRUTURA		
OBJETIVO		Projetar infraestrutura predial e viária voltada à acessibilidade				
Item	Cenário em 2019	Meta 2020	Concluído (Sim/ Não)	Evidenciar (indicadores, links de editais, motivos de não conclusão)		Grau de Eficácia (realizado/planejado (Proporcional))
9.4.5	40%	Manter e prover a acessibilidade da frota capaz de atender as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida até 2024	Sim	<p>Meta 2020 - 40% (CSO)</p> <p>A frota dos Campi CPCE e CAFS e colégios CTBJ e CTF é capaz de atender a meta em virtude dos contratos Nº 35/2017 e 38/2017. Ainda está em elaboração um Termo de Referência para contratação dos serviços em questão para o CMPP e CSHNB por meio do processo nº 23111.027556/2020-41.</p>		100%
9.4.6	Não há projeto	Elaborar e executar projeto de acessibilidade na BCCB quanto à sua edificação, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos (NBR 9050)	Sim	<p>Meta 2020 - 0% (CP, CLOS E COS)</p> <p>Estão sendo desenvolvidos projetos de acessibilidade para a BCCB e para o espaço de convivência Rosa dos Ventos, por meio dos processos nº 23111.064917/2019-97 e nº23111.036859/2020-9, respectivamente.</p>		100%

9	TEMA ESTRATÉGICO		INFRAESTRUTURA			
OBJETIVO		Elaborar planos de manutenção preventiva				
Item	Cenário em 2019	Meta 2020	Concluído (Sim/ Não)	Evidenciar (indicadores, links de editais, motivos de não conclusão)		Grau de Eficácia (realizado/planejado (Proporcional))
9.5.1	10%	Elaborar planos de manutenção preventiva de todos os serviços/demandas inerentes à Coordenação de Manutenção Patrimonial até 2024	Não	Meta 2020 - 20% (CMP) Apenas em 2020 foi habilitada a ferramenta SINAPSE para gerenciar os serviços de manutenção da UFPI e assim gerar os dados necessários para elaboração dos planos de manutenção preventiva. Portanto, essa meta será trabalhada e executada no ano de 2021.		0%
9.5.2	0%	Registrar planos de manutenção preventiva de 75% dos serviços/demandas inerentes à Coordenação de Manutenção Patrimonial até 2024	Não	Meta 2020 - 10% (CMP) Apenas em 2020 foi habilitada a ferramenta SINAPSE para gerenciar os serviços de manutenção da UFPI e assim gerar os dados necessários para elaboração dos planos de manutenção preventiva. Portanto, essa meta será trabalhada e executada no ano de 2021.		0%

9	TEMA ESTRATÉGICO		INFRAESTRUTURA		
OBJETIVO		Atender as solicitações de melhorias e ampliação de infraestrutura física, elétrica, água e esgoto			
Item	Cenário em 2019	Meta 2020	Concluído (Sim/ Não)	Evidenciar (indicadores, links de editais, motivos de não conclusão)	Grau de Eficácia (realizado/planejado (Proporcional))
9.6.1	10%	Atender 80% da demanda por melhorias nos sistemas de drenagem dos Campi até 2024	Sim	<p>Meta 2020 - 40% (CMP e CP)</p> <p>Nos projetos elaborados e contratados em 2020, Reforma dos restaurantes universitários e Substituição da cobertura do espaço de convivência, foram previstas melhorias no sistema de drenagem.</p> <p>Em relação aos serviços de manutenção solicitados, foram realizados por meio do Contrato nº 61/2019 com objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA. CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELA E UNIDADES EXTERNAS (CCS E CEAD) TERESINA -PI.</p>	100%
9.6.2	30%	Atender 90% da demanda por melhorias nos sistemas de coleta e tratamento de esgoto dos Campi até 2024	Sim	<p>Meta 2020 - 40% (CMP e CP)</p> <p>Nos projetos elaborados e contratados em 2020, reforma dos restaurantes universitários e substituição da cobertura do espaço de convivência, foram previstas melhorias no sistema de coleta e tratamento de esgoto.</p> <p>Em relação aos serviços de manutenção solicitados, estão sendo realizados por meio do Contrato nº 61/2019 com objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA. CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELA E UNIDADES EXTERNAS (CCS E CEAD) TERESINA -PI e do Contrato Nº 02/2018 com objeto FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E/OU DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DESTINADO A ATENDER AOS PRÉDIO DA CONTRATANTE QUE ABRIGAM A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, NO MUNICÍPIO DE TERESINA – PI.</p>	100%

9		TEMA ESTRATÉGICO		INFRAESTRUTURA		
OBJETIVO		Atender as solicitações de melhorias e ampliação de infraestrutura física, elétrica, água e esgoto				
Item	Cenário em 2019	Meta 2020	Concluído (Sim/ Não)	Evidenciar (indicadores, links de editais, motivos de não conclusão)		Grau de Eficácia (realizado/planejado (Proporcional))
9.6.4	5%	Atender 50% da demanda por melhorias nos sistemas de fornecimento de energia dos Campi até 2024	Sim	<p>Meta 2020 - 10% (CMP e CP)</p> <p>As demandas foram atendidas por meio do contrato de nº 09/2018 com objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELÉTRICA DE ALTA E BAIXA TENSÃO, PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELA, EM TERESINA e do Contrato nº 61/2019 com objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA. CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELA E UNIDADES EXTERNAS (CCS E CEAD) TERESINA -PI.</p>		100%
9.6.5	2%	Atender 30% da demanda por melhoria nos sistemas de iluminação dos campi até 2024	Sim	<p>Meta 2020 - (5% CMP e CP)</p> <p>As demandas foram atendidas com aquisição de 9.500 lâmpadas LED e por meio do contrato de nº 09/2018 com objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELÉTRICA DE ALTA E BAIXA TENSÃO, PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELA, EM TERESINA e do Contrato nº 61/2019 com objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA. CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELA E UNIDADES EXTERNAS (CCS E CEAD) TERESINA -PI.</p>		100%
9.6.7	60%	Atender 80% da demanda por recuperação e ampliação do sistema viário dos Campi até 2024	Sim	<p>Meta 2020 - 60% (CMP e CP)</p> <p>As demandas foram atendidas por meio do Contrato nº 61/2019 com objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA. CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELA E UNIDADES EXTERNAS (CCS E CEAD) TERESINA -PI</p>		100%

9		TEMA ESTRATÉGICO		INFRAESTRUTURA		
OBJETIVO		Executar melhorias de infraestrutura predial				
Item	Cenário em 2019	Meta 2020	Concluído (Sim/ Não)	Evidenciar (indicadores, links de editais, motivos de não conclusão)		Grau de Eficácia (realizado/planejado (Proporcional))
9.7.1	Não há sinalização	Instalar placas e faixas de sinalização no estacionamento da biblioteca, bem como arborizar o espaço e melhorar a iluminação interna e externa na biblioteca	Não	Meta 2020 - Elaborar projeto - (CP, CMP, CSO) O projeto em questão está em elaboração por meio do processo 23111.036859/2020-90 e tem previsão de conclusão em 2021.		50%
9.7.3	-	Trocar ou prover melhorias estruturais no teto da BCCB	Sim	Meta 2020 - 0% (CP e CLOS) Foi licitado por meio do processo 23111.026680/2020-25 o Projeto básico de reforma da cobertura do espaço de conveniência.		100%

10		TEMA ESTRATÉGICO		ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL		
OBJETIVO		Promover projetos de assistência, moradia, alimentação e transporte				
Item	Cenário em 2019	Meta 2020	Concluído (Sim/ Não)	Evidenciar (indicadores, links de editais, motivos de não conclusão)		Grau de Eficácia (realizado/planejado (Proporcional))
10.4.3	Residência compartilhada entre o ensino técnico e o ensino superior	Construir uma residência universitária para os alunos da UFPI no Campus CASF	Não	Meta 2020 - planejamento, análises, elaboração de projeto, dotação orçamentária (CP, CLOS E COS) A PREUNI não recebeu o processo com o Programa de Necessidades do demandante.		0%
10.4.4	Residências com necessidades de reformas e ajustes	Reformar as cinco unidades residências universitárias existentes atualmente na UFPI	Não	Meta 2020 - planejamento, análises, elaboração de projeto, dotação orçamentária (CP, CLOS E COS) A PREUNI recebeu apenas 01 processo com o Programa de Necessidades de Reforma de Residência no CMPP, este possui projeto concluído. Faltam processos das demais residências.		20%

10		TEMA ESTRATÉGICO		ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL		
OBJETIVO		Promover projetos de assistência, moradia, alimentação e transporte				
Item	Cenário em 2019	Meta 2020	Concluído (Sim/ Não)	Evidenciar (indicadores, links de editais, motivos de não conclusão)		Grau de Eficácia (realizado/planejado (Proporcional))
10.4.5	0	Construção de mais um restaurante universitário em Teresina (administração, armazenamento, produção e distribuição de refeições).	Não	Meta 2020 - planejamento, análises, elaboração de projeto, dotação orçamentária (CP, CLOS E COS) A PREUNI não recebeu o processo com o Programa de Necessidades do demandante.		0%
10.4.6	0	Reforma das seis cozinhas e refeitórios dos 6 restaurantes universitários	Sim	Meta 2020 - planejamento, análises, elaboração de projeto, dotação orçamentária (CP, CLOS E COS) Foram licitadas, por meio do processo 23111. 029733/2020-44, a Reforma do RU Central e RU do CCA.		33%
10.4.7	0	Implantar até 2024 transporte acessível para circulação no Campus Ministro Petrônio Portella	Não	Meta 2020 - ter pelo menos 1 transporte acessível (CSO) Está em elaboração, por meio do processo 23111.027556/2020-41, Termo de Referência com objeto de Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos para a frota fixa e na locação de veículos por acionamento para todos os Campi que visa atender a meta em questão. Dessa forma, esta meta será trabalhada no Plano Operacional da PREUNI de 2021.		10%

Fonte: PREUNI, 2021.

No contexto da pandemia de COVID-19, a PREUNI, com o objetivo de mitigar as dificuldades vivenciadas pela comunidade da UFPI e atender aos Protocolos de biossegurança para retorno das atividades nas Instituições Federais de Ensino do Ministério da Educação – MEC, realizou levantamentos e geriu a contratação de serviços e compras de materiais conforme Quadro 3.

Quadro 3. Ações realizadas pela PREUNI no âmbito da pandemia COVID-19.

Unidade	AÇÃO	DESCRIÇÃO
1	Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância	Aquisição de Tapetes sanitizantes - processo nº 23111.034159/2020-46
2		Aquisição de Termômetro Clínico - processo nº 23111.034261/2020-08
3		Aquisição de Dispensers para sabão e álcool em gel - processo nº 23111.034426/2020-15
4		Aquisição de totens para álcool em gel - processo nº 23111.033959/2020-14
5		Aquisição de barreiras acrílicas – processo nº 23111.039010/2020-19
6		Contratação de serviços de limpeza interna – processo nº 23111.059783/2018-08
7		Estudo de locação de lavatórios e equipamentos adquiridos
9		Projetos de adaptações dos Restaurantes, Bibliotecas e Clínicas odontológicas

IX - A AVALIAÇÃO GERAL DA UNIDADE ACERCA DOS RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2020

1) Qual o percentual geral de grau de eficácia em relação às metas estabelecidas para 2020?

Considerando o alcance das metas estabelecidas para 2020, a PREUNI atingiu um grau de eficácia de 66%, atingindo 27 metas de uma totalidade de 41. Este fato significa que, apesar das limitações impostas pela Pandemia, esta unidade conseguiu ter um bom desempenho. Podemos destacar:

- Dentre as metas alcançadas 5% não estavam previstas para 2020; e
- Dentre as 14 metas não atingidas, 2 não foram executadas em virtude da pandemia (14%), 4 estão programadas para 2021 (28%), 4 foram iniciadas e realizadas parcialmente em 2020 (28%) e 7 dependem de contratação de novos servidores, setores que não requisitaram informações para a PREUNI ou até que não apresentaram programa de necessidades de obras futuras (50%).

2) Quais as principais ações desenvolvidas pela unidade que impactaram positivamente a sua gestão, de modo a garantir a cadeia de valor/mapa estratégico traçada por ela (PDU) e pela UFPI (PDI)?

- Elaboração do PDU e do plano anual de aquisição e compra de bens e serviços - contribuiu para melhorar a execução dos recursos, à medida que proporcionou um alinhamento entre as demandas, os custos e o planejamento estratégico da unidade;
- Estimulação das unidades hierárquicas a adoção de práticas e ferramentas de Gestão de Projetos no planejamento e execução das atividades da unidade – facilitou o acompanhamento das atividades realizadas em cada unidade, bem como colaborou no planejamento da realização de cada projeto demandado;
- Elaboração de projeto para acompanhar a execução do plano de logística sustentável da UFPI pelas unidades – contribuiu para identificar os agentes envolvidos e no levantamento de possíveis estratégias para realização de cada meta prevista no PLS 2018-2020;
- Levantamento de demandas para implantação de soluções de TI para atender 75% da demanda da PREUNI de informatização de suas atividades – contribuiu no estudo para levantamento da necessidade de cada setor e possíveis estratégias que facilitarão atendimento e realização de atividades em menor tempo, bem como facilitará o levantamento de dados importantes inerentes à UFPI;
- Contratação de melhorias estruturais no teto da BCCB – contribuiu para redução de gastos feitos com manutenção no espaço que envolve não

somente a biblioteca central, como também cine teatro, livraria, editora, restaurantes, espaços de bancos e outros;

- Levantamentos e gestão da contratação de serviços e compras de materiais com o objetivo de mitigar as dificuldades vivenciadas pela comunidade da UFPI na pandemia de COVID-19 - contribuiu para a efetivação de várias ações que possibilitaram o combate da pandemia e seus efeitos e garantiu o fortalecimento do ensino, da pesquisa e da extensão mesmo em situações adversas e o compromisso social da UFPI de atender às demandas da população, conforme definidos no PDI da instituição.

3) Quais os fatores (externos e internos) que dificultaram/facilitaram o cumprimento dos objetivos e metas da sua unidade e impactaram positivamente/negativamente a cadeia de valor/mapa estratégico traçada pela unidade (PDU) e pela UFPI?

Para o desenvolvimento das atividades da PREUNI em 2020, como todos os setores, a Pandemia foi um fator que impediu ou dificultou a realização de algumas metas estabelecidas, tais como: Identificar e mapear na PREUNI no mínimo 10 macroprocessos e acompanhar a execução dos eixos de responsabilidade da PREUNI definidos no Plano de Logística Sustentável. Contudo, o próprio contexto pandêmico proporcionou a otimização do tempo por meio do uso das tecnologias digitais da informação e comunicação, ocasionando maior celeridade na tramitação dos demais processos e metas atingidas.

X - PLANEJAMENTO DA PREUNI PARA 2021

Abaixo todos os objetivos e metas gerais do PDU do ano de 2021.

Quadro 4. Objetivos e metas gerais do PDU para o ano de 2021.

<u>OBJETIVOS E METAS GERAIS DO PDU PARA O ANO DE 2021</u>
TEMA ESTRATÉGICO: GESTÃO E GOVERNANÇA
<i>Objetivo: prover uma gestão moderna, eficiente, transparente e desburocratizada</i>
Elaborar plano anual de aquisição e compra de bens e serviços, conforme específico no PDI / PDU
<i>Objetivo: fortalecer as boas práticas de governança, transparência da informação e gestão orientado a resultado</i>
Identificar e mapear na PREUNI no mínimo 10 macroprocessos BPMN (Business Process Model and Notation)
Consolidar o novo Regimento Interno até 2020, e demais normativos até 2023
Estimular em 100% das unidades hierárquicas a adoção de práticas e ferramentas de Gestão de Projetos no planejamento e execução das atividades da unidade
Possuir página eletrônica e realizar atualizações frequentes (no mínimo uma vez por mês) e ter aba específica para acompanhamento do PDI e PDU
TEMA ESTRATÉGICO: SUSTENTABILIDADE
<i>Objetivo: acompanhar, publicizar e atualizar o plano de sustentabilidade da UFPI</i>
Acompanhar a execução dos eixos de responsabilidade da PREUNI definidos no Plano de Logística Sustentável
Executar 100% das práticas definidas no plano de sustentabilidade da UFPI, nos eixos temáticos de responsabilidade da PREUNI, até 2024
Atualizar em 2021 e 2024 o plano de logística sustentável da UFPI
Escrever projeto para acompanhar a execução do plano de logística sustentável da UFPI pelas unidades
TEMA ESTRATÉGICO: TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
<i>Objetivo: promover gestão de tecnologia da informação e dinamizar a comunicação interna e externa UFPI</i>
Implantar soluções de TI para atender 75% da demanda da PREUNI de informatização de suas atividades
TEMA ESTRATÉGICO: INFRAESTRUTURA

<i>Objetivo: prover e gerir os projetos de ampliação de área construída da UFPI</i>
Prover e gerir 40% dos projetos de edificações, reformas, adaptações e ampliações da UFPI até 2024
Prover e gerir 100% da contratação / licitação de obras e serviços de engenharia de interesse da UFPI, de acordo com a demanda durante os exercícios de 2020-2024
Prover 75% da manutenção predial das edificações da UFPI até 2024
Gerir 100% da manutenção predial das edificações da UFPI até 2024
Implantar a infraestrutura física definitiva da PREUNI, em uma única sede, até 2024
Atender no mínimo 80% das demandas de edificações/reformas/ampliações específicas no PDI
Construir o prédio definitivo do Centro Educação Aberta e a Distancia – CEAD até 2024
<i>Objetivo: prover e gerir a gestão ambiental e segurança da UFPI</i>
Melhorar em 10% a segurança pessoal e patrimonial da UFPI até 2024
Implantar projeto/programa de gestão ambiental da UFPI até 2024
Adaptar e regularizar 100% das edificações existentes para as normas de combate a incêndio e pânico nos Campi
Implantar sistema contra incêndio na BCCB
<i>Objetivo: desenvolver, implantar e executar projeto institucional de eficiência energética</i>
Elaborar, executar e acompanhar projeto de eficiência energética
Elaborar diagnóstico da situação atual até 2021
<i>Objetivo: projetar infraestrutura predial e viária voltada à acessibilidade</i>
Projetar infraestrutura predial voltada à acessibilidade de 50% das edificações da UFPI até 2024
Projetar infraestrutura viária (incluindo calçadas) voltada à acessibilidade de 20% das instalações da UFPI até 2024
Manter infraestrutura predial voltada à acessibilidade de todas as edificações da UFPI
Manter infraestrutura viária (incluindo calçadas) voltada à acessibilidade de 50% das instalações da UFPI
Manter e prover a acessibilidade da frota capaz de atender as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida até 2024

Elaborar e executar projeto de acessibilidade na BCCB quanto à sua edificação, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos (NBR 9050)
<i>Objetivo: elaborar planos de manutenção preventiva</i>
Elaborar planos de manutenção preventiva de todos os serviços/demandas inerentes à Coordenação de Manutenção Patrimonial até 2024
Registrar planos de manutenção preventiva de 75% dos serviços/demandas inerentes à Coordenação de Manutenção Patrimonial até 2024
Implantar planos de manutenção preventiva de 50% dos serviços/demandas inerentes à Coordenação de Manutenção Patrimonial até 2024
<i>Objetivo: atender as solicitações de melhorias e ampliação de infraestrutura física, elétrica, água e esgoto</i>
Atender 80% da demanda por melhorias nos sistemas de drenagem dos Campi até 2024
Atender 90% da demanda por melhorias nos sistemas de coleta e tratamento de esgoto dos Campi até 2024
Atender 100% da demanda por melhorias nos sistemas de abastecimento de água dos Campi até 2024
Atender 50% da demanda por melhorias nos sistemas de fornecimento de energia dos Campi até 2024
Atender 30% da demanda por melhoria nos sistemas de iluminação dos campi até 2024
Implantar 100% da demanda por sistemas de tratamento e controle da qualidade de água nos Campi até 2024
Atender 80% da demanda por recuperação e ampliação do sistema viário dos Campi até 2024
<i>Objetivo: executar melhorias de infraestrutura predial</i>
Instalar placas e faixas de sinalização no estacionamento da biblioteca, bem como arborizar o espaço e melhorar a iluminação interna e externa na biblioteca
Construir a biblioteca setorial do Centro de Tecnologia
Trocar ou prover melhorias estruturais no teto da BCCB
Construir ou reformar um espaço existente para funcionar como centro de saúde integrado e multiprofissional para oferta de serviços à comunidade e realização de pesquisas clínicas
Construir ou reformar espaço existente para funcionar como laboratório multiusuário para biotecnologia, genômica e registros de sinais biológicos

TEMA ESTRATÉGICO: ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
<i>Objetivo: promover projetos de assistência, moradia, alimentação e transporte</i>
Construir uma residência universitária para os alunos da UFPI no Campus CASF.
Reformar as cinco unidades residências universitárias existentes atualmente na UFPI
Construção de mais um restaurante universitário em Teresina (administração, armazenamento, produção e distribuição de refeições).
Reforma das seis cozinhas e refeitórios dos 6 restaurantes universitários
Implantar até 2024 transporte acessível para circulação no Campus Ministro Petrônio Portella

Fonte: PREUNI, 2020.

XI – DADOS ESPECÍFICOS DA UNIDADE

PREUNI

Tabela 1. Detalhamento da área física da UFPI (2020).

ÁREAS UFPI EM 2020			
LOCAL	ÁREA TERRENO (m ²)	ÁREA CONSTRUÍDA ATÉ 2019 (m ²) *	ÁREA CONSTRUÍDA ATÉ 2020 (m ²) **
TERESINA-PI			
ININGA	1.466.555,39	158.824,89	158.759,51
SOCOPO	2.192.401,00	31.408,29	31.408,29
CEAD	1.364,88	1.025,70	1.025,70
CCS CENTRO	2.693,02	1.908,68	1.908,68
TOTAL TERESINA	3.663.014,29	193.167,56	193.102,18
PICOS-PI			
CAMPUS	128.602,26	16.938,30	16.938,30
TOTAL PICOS	128.602,26	16.938,30	16.938,30
FLORIANO			
CAMPUS E CTF	134.048,62	18.291,69	18.291,69
FAZENDA	1.584.144,52	2.443,45	2.443,45
TOTAL FLORIANO	1.718.193,14	20.735,14	20.735,14
BOM JESUS			
CAMPUS E CTBJ	506.533,90	22.217,58	22.217,58
FAZENDA BOM JESUS	224.146,49	2.680,52	2.680,52
FAZENDA ALVORADA DO GURGUÉIA	4.006.400,00	2.904,71	2.904,71
TOTAL BOM JESUS	4.737.080,39	27.802,81	27.802,81
PARNAÍBA			
CAMPUS	50.739,31	31.454,63	32.321,86
CAPITÃO CLARO	974,54	791,22	791,22
PSICULTURA	230.717,77	721,64	721,64
TERRENO DOADO PROX IFPI (SEM CONSTR)	250.019,00		-
TOTAL PARNAÍBA	532.450,62	32.967,49	33.834,72
TOTAL UFPI	10.779.340,70	291.611,30	292.413,15

* APÓS CONFERÊNCIA EM 2020, AS INFORMAÇÕES PUBLICADAS NO RELATÓRIO DE 2019 TIVERAM QUE SER ALTERADAS. A ÁREA CONSTRUÍDA PASSOU DE 309.837,61 M² (RELATÓRIO 2019) PARA 291.611,30 M² (RELATÓRIO 2020).

** ACRÉSCIMO DE ÁREA DA UFPI 2019-2020 DEVIDO A CONCLUSÃO DA ESCOLA DE APLICAÇÃO EM PARNAÍBA.

Fonte: Coordenadoria de Projetos/PREUNI, 2020.

Tabela 2. Evolução de área construída da UFPI (2014-2020).

EVOLUÇÃO DE ÁREAS CONSTRUIDAS DA UFPI											
CAMPUS	LOCAL	ATÉ 2004	2004 A 2010	2010 A 2013	ATÉ DEZEMBRO/2014	ATÉ DEZEMBRO/2015	ATÉ DEZEMBRO/2016	ATÉ DEZEMBRO/2017	ATÉ DEZEMBRO/2018 (1)	ATÉ DEZEMBRO/2019 (1) (2)	ATÉ DEZEMBRO/2020 (1) (2)
CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA	TERESINA - PI	119.087,87	3.051,43	57.688,69	179.827,99	195.786,68	209.651,49	209.651,49	190.936,33	193.167,56	193.102,18
CAMPUS MINISTRO REIS VELLOSO	PARNAÍBA- PI	8.298,44	1.995,48	7.521,22	17.815,14	18.794,59	31.715,86	32.715,86	32.958,40	32.967,49	33.834,72
CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES	PICOS - PI	9.429,08	4.163,05	2.035,23	15.627,36	15.627,36	16.004,50	16.062,46	16.345,11	16.938,30	16.938,30
CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL	FLORIANO - PI	6.968,43		13.641,78	20.610,21	20.610,21	20.610,21	21.545,57	21.545,57	20.735,14	20.735,14
CAMPUS PROFESSORA CINOBELINA ELVAS	BOM JESUS - PI	13.824,94		10.276,98	24.101,92	27.398,06	27.329,86	27.329,86	27.551,18	27.802,81	27.802,81
ÁREA TOTAL EDIFICADA		157.608,76	9.209,96	91.163,90	257.982,62	278.216,90	305.311,92	307.305,24	289.336,59	291.611,30	292.413,15

(1) – NOVA CONTAGEM DE ÁREA DE TERESINA, DESCONSIDERANDO A ÁREA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (21.375,40 M²), QUE DEIXOU DE SER COMPUTADO EM 2018. ÁREAS DA UFPI SEM HJ EM 2016 (283.936,52M²) E EM 2017 (285.929,84M²).

(2) – FOI REALIZADO UMA NOVA CONFERÊNCIA NAS ÁREAS EDIFICADAS DA UFPI EM 2019 (CORREÇÕES NAS ÁREAS DE PARNAÍBA E FLORIANO). ENTRETANTO, NA HORA DA SOMA, EM FLORIANO SOMOU-SE A MAIS AS ÁREAS DO CTF, CAFS E FAZENDA. VALOR QUE FOI CORRIGIDO EM 2020. NÃO HOUE ACRÉSCIMO DE ÁREA EM FLORIANO DE 2019-2020 (A ÁREA PARA OS DOIS ANOS FOI A MESMA 20.735,14 M²). DESSA FORMA O VALOR DE **ÁREA DA UFPI EM DEZ DE 2019 FOI DE 291.611,30,92 M²**. O ACRÉSCIMO DE ÁREA DA UFPI DE 2019-2020, OCORREU COM A OBRA DA ESCOLA DE APLICAÇÃO EM PARNAÍBA (867,23 M²).

Fonte: Coordenadoria de Projetos/PREUNI, 2020.

Quadro 5. Quantitativo de serviços e obras de engenharia e arquitetura por situação (2020)

Situação	Quantidade
Projeto elaborado	19
Projeto em licitação	5
Projeto em execução	26
Obra em andamento	8
Obra concluída	0
Paralisado	0
Distrato	0

Fonte: PREUNI, 2020.

Quadro 6. Serviços de engenharia e arquitetura (2020)

Situação/Descrição do Serviço+A47:I54	Nº	Unidade	Tipo de Serviço*	Origem do Recurso	Registro no Simec (S/N)	Valor Estimado (R\$)	Valor Pago (R\$)	Área(m²)
Em execução								
Prédio do Centro de Ciências Agrárias no Campus Ministro Petrônio Portella, em Teresina, Piauí	1	1	Construção	PTRES 108565 FONTE DE RECURSO 8100 UGR 154098 NATUREZA DA DESPESA 44.90.51	N	1.947.642,47	-	995,59
Reforma e Ampliação da Clínica de Grandes Animais, no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Piauí, Campus Ministro Petrônio Portella, em Teresina PI	2	1	Reforma e Ampliação	PTRES 170305 FONTE DE RECURSO 8250262790 UGR 152660	N	215.182,74	-	49,00
Usinas de Placas Fotovoltaicas	3	1	Investimento	GESTÃO/UNIDADE: 15265/154048 NOTA DE EMPENHO: 2019NE001296	N	2.207.352,00	-	-
Reforma do Centro de Convivência para Adaptação do Sistema de Combate a Incêndio e Pânico	4	1	Reforma	PTRES 176555 FONTE DE RECURSO 8106261010 UGR 156182 NATUREZA DA DESPESA 44.90.51	N	2.068.633,14	-	12.995,98

Obra do Galpão do Almoarifado – Anexo II do Campus Ministro Petrônio Portella, em Teresina, Piauí	5	1	Construção	PTRES 170305 FONTE DE RECURSO 8100 UGR 154087 NATUREZA DA DESPEZA 44.90.51	N	489.605,34	-	515,20
Reforma e Ampliação dos Restaurantes Universitários, Unidades Central e III, no Campus Ministro Petrônio Portella, em Teresina, Piauí	6	1	Reforma e Ampliação	PTRES 170305/170306/189486 FONTE DE RECURSO 8100/0100/8144 UGR 154356	N	2.034.657,56	-	2.504,55
Obra do prédio Núcleo de Assistência Estudantil – NAE, no Campus Senador Helvídio Nunes de Barros, em Picos, Piauí	7	1	Construção	PTRES 108565 FONTE DE RECURSO 8100 UGR 154103 NATUREZA DA DESPEZA 44.90.51	N	616.163,45	-	251,63
Construção do Prédio do curso de medicina, ampliação do bloco existente, urbanização e complementação da drenagem e do muro do campus, no Campus de Picos, Picos/PI	8	1	Construção	PTRES 108565 FONTE DE RECURSO 8100 UGR 154103 NATUREZA DA DESPEZA 44.90.51	N	1.663.336,25	-	360,26
Total Geral		8				11.242.572,95		

Fonte: Coordenadoria de Obras e Serviços/PREUNI, 2020.

* Tipos de serviços: Reforma, Adaptação, Manutenção e Ampliação

Quadro 7. Estrutura de Acessibilidade Arquitetônica ou Física por Campus e Centro (2020)

Campus/ Centro/ Colégios Técnicos	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	Total
Prefeitura Universitária - Sede	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	Sim	3
Prefeitura Universitária - CSO e CMP	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	Não	3
Prefeitura Universitária - Vigilância	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Não	1
Total Geral	0	0	7	0		7						

Fonte: PREUNI, 2020.

Legenda:

- (1) Sinalização tátil
- (2) Rampa de acesso com corrimão
- (3) Entrada/Saída com dimensionamento
- (4) Bebedouros e lavabos adaptados
- (5) Sinalização sonora
- (6) Sinalização Visual
- (7) Elevadores
- (8) Banheiros adaptados
- (9) Atendimento (área ou balcão) adaptados
- (10) Mobiliário adaptado
- (11) Ambientes desobstruídos que facilitem a movimentação de cadeirantes e pessoas com deficiência visual

GESTÃO PATRIMONIAL E INFRAESTRUTURA

1. Conformidade legal

a) Legislação Aplicada

Os principais instrumentos relacionados à contratação de serviços de obras de engenharia são:

Lei 8.666/1993, Lei 12.462/2011, Decreto 7.581/2011, Lei 14.065/2020. Lei 8.666/1993, Lei 12.462/2011, Decreto 7.581/2011 e Lei 14.065/2020.

2. Investimentos de capital

a) Informações sobre a situação das obras e Serviços de Engenharia pendentes, iniciadas ou finalizadas no exercício

Quadro 8. Obras e Serviços de Engenharia (2020).

Unidade	Processo(s)	Objeto	CNPJ da Contratada	Nº do Contrato ¹	Vigência do Contrato ²	Aditivo de Prazo ³	Situação da Obra ⁴	Percentual de Execução Previsto ⁵	Percentual de Execução Realizado ⁶	Valor Licitado ⁷ (R\$)	Valor Aditivo ⁸ (R\$)	Valor Empenhado ⁹ (R\$)	Valor Liquidado ¹⁰ (R\$)	Valor Pago ¹¹ (R\$)
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2018	23111.023827/2017-96	Prédio do Centro de Ciências Agrárias no Campus Ministro Petrônio Portella, em Teresina, Piauí	26.369.947/001-68	19/2019	Início 03/06/2019 Final 21/02/2021	270	Em andamento	68,51%	68,51%	1.773.072,75	174.569,72	1.947.642,47	1.334.337,52	1.334.337,52
CONVITE Nº 01/2020	23111.028056/2016-42	Reforma e Ampliação da Clínica de Grandes Animais, no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Piauí, Campus Ministro Petrônio Portella, em Teresina PI	18.471.673/001-95	25/2020	Início 20/07/2020 Final 16/01/2021	60	Em andamento	80,00%	80,00%	215.182,74	-	215.182,74	172.146,19	172.146,19

RDC 03/2018 IFSULDEMI NAS	23111.082714/ 2019-19	Usinas de Placas Fotovoltaicas	18.207.297/0 001-26	08/202 0	Início 30/01/2 020 Final 23/05/2 021	180	Em andame nto	47,21%	47,21%	2.207.352 ,00	-	2.207.352 ,00	1.042.090 ,87	1.042.090 ,87
RDC 02/2020	23111.026680/ 2020-25	Reforma do Centro de Convivência para Adaptação do Sistema de Combate a Incêndio e Pânico	11.344.183/0 001-89	03/202 1	Início 22/01/2 021 Final 21/07/2 021	sem aditiv o	Em andame nto	0,00%	0,00%	2.068.633 ,14	-	2.068.633 ,14	-	-
RDC 03/2020	23111.024875/ 2020-66	Obra do Galpão do Almoxarifado – Anexo II do Campus Ministro Petrônio Portella, em Teresina, Piauí	26.369.947/0 001-68	01/202 1	Início 20/01/2 021 Final 21/03/2 021	sem aditiv o	Em andame nto	0,00%	0,00%	489.605,3 4	-	489.605,3 4	-	-
RDC 04/2020	23111.029733/ 2020-44	Reforma e Ampliação dos Restaurante s Universitário s, Unidades Central e III, no Campus Ministro Petrônio Portella, em Teresina, Piauí	17.314.738/0 001-26	02/202 1	Início 21/01/2 021 Final 17/11/2 021	sem aditiv o	Em andame nto	0,00%	0,00%	2.034.657 ,56	-	2.034.657 ,56	-	-
TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2018	23111.022655/ 2017-33	Obra do prédio Núcleo de Assistência Estudantil – NAE, no	03.981.182/0 001-17	30/201 9	Início 31/07/2 019 Final 22/12/2 020	60	Em andame nto	85,00%	85,00%	616.163,4 5	-	616.163,4 5	523.738,9 3	523.738,9 3

		Campus Senador Helvídio Nunes de Barros, em Picos, Piauí												
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019	23111.069087/2018-30	Construção do Prédio do curso de medicina, ampliação do bloco existente, urbanização e complementação da drenagem e do muro do campus, no Campus de Picos, Picos/PI	26.369.947/001-68	65/2019	Início 02/01/2020 Final 25/02/2021	120	Em andamento	45,52%	45,52%	1.515.158,67	148.177,58	1.663.336,25	757.140,85	757.140,85

Fonte: Coordenadoria de Obras e Serviços/PREUNI, 2021.

Legenda:

- 1 Nº do contrato constante no processo de contratação;
- 2 Data conforme contrato inicial xx/xx/xxxx;
- 3 informar em dias, o total do prazo aditivado do contrato, caso tenha havido;
- 4 Situação da Obra: Em Andamento; paralisada; finalizada;
- 5 Percentual de execução previsto no cronograma físico financeiro (atualizado) da obra até 31/12 do exercício de referência;
- 6 Percentual de execução realizado total da obra até 31/12 do exercício de referência;
- 7 Valor adjudicado;
- 8 Valor acrescido ao contrato (caso haja);
- 9 Valor empenhado até 31/12 do exercício de referência, extraído do SIAFI;
- 10 Montante liquidado até 31/12 do exercício de referência extraído do SIAFI;
- 11 Montante pago até 31/12 do exercício de referência extraído do SIAFI.

b) Avaliação e impactos dos investimentos de capital

Quadro 9. Justificativas dos investimentos.

Descrição	Demandante	Justificativa do demandante
T.P. Nº 05/2018 - UFPI	CCA	Considerando a necessidade de infraestrutura física adequada para atender a demanda da Pós-Graduação do Centro de Ciências Agrárias (CCA) da Universidade Federal do Piauí (UFPI), cujos programas de Pós graduação abrangem as áreas de Agronomia – Agricultura Tropical (Mestrado e Doutorado), Ciência Animal (Mestrado e Doutorado) e Genética e Melhoramento Vegetal (Mestrado), e oferecer o espaço físico necessário, para sediar esses 3 programas de Pós-Graduação desse Centro atualmente existentes, foi elaborado o Projeto Básico de uma edificação térrea com área total de 995,59 m ² de área útil, a ser edificada em espaço contíguo ao prédio atual do espaço Integrado do CCA.
RDC 03/2018 - IFSULDEMINAS	PROPLAN	Tendo em vista a necessidade de implantarmos soluções eficientes e sustentáveis no fornecimento de energia limpa, além de visar a sustentabilidade financeira, os módulos geradores de energia solar fotovoltaicos serão implementados no Campus sede da UFPI e demais unidades vinculadas. Assim justifica-se a necessidade do aporte financeiro deste Termo de Referência (TR) a fim de possibilitar a otimização de recursos gerenciados por essa IFES, possibilitando maiores investimentos nas atividades finalísticas (ensino, extensão e pesquisas desenvolvidas no âmbito da UFPI).
RDC 03/2020 - UFPI	Pró-Reitoria de Administração	A Pró-Reitoria de Administração tem a necessidade de local próprio para acomodação de bens permanentes adquiridos, bens inservíveis recolhidos das unidades acadêmicas e administrativas e documentos diversos desta IFES. Atualmente a Universidade Federal do Piauí conta com um contrato de locação, cujo objeto é a disponibilização de um galpão para acomodar bens e documentos, com um custo anual de R\$ 117.909,84. Além do valor da locação, são pagos energia elétrica, água, IPTU e postos de vigilância diurno e noturno. Só os postos de vigilância custam anualmente R\$ 238.217,76.
T. P. Nº 06/2018 - UFPI	Diretoria do Campus	A implantação dos NAE's nos Campi fora de sede em outubro de 2014 é resultado da expansão da Assistência Estudantil fomentada pelo Governo Federal, que vem investindo ao longo dos últimos 15 anos recursos na democratização do acesso ao ensino superior e na criação de uma política de assistência ao universitário, permitindo às instituições de Ensino Federal implantar e consolidar os programas, projetos e ações de assistência estudantil e compor equipes multidisciplinares de profissionais capacitados. Atualmente a equipe é composta por: 2 assistentes sociais, 1 psicóloga, 1 pedagoga, 1 cirurgiã dentista e 1 assistente administrativo, há a previsão de implantação da sala de amamentação. Quadro que ainda é insuficiente para atender a demanda do Campus, e que também é comprometido pela falta de estrutura física. Neste sentido é necessário a construção de prédio que abrigue os espaços físicos para atender as demandas dos serviços assistenciais a serem prestados.

T. P. Nº 02/2019 - UFPI	Diretoria do Campus	O curso de Medicina existente no Campus Senador Helvídio Nunes de Barros, em Picos – PI, iniciou em 2016 com o mínimo de estrutura física para funcionar (2 salas de aula e 4 salas de tutoria), e as demais estruturas foram compartilhadas pelo as demais instalações do Campus. Em 2017 foi realizado a ampliação desse prédio, contemplando áreas administrativas (coordenação e secretaria). Em 2018, com a entrada de novas turmas no curso, a estrutura tornou-se insuficiente para atender a demanda. Para tanto, será necessário realizar ampliação da estrutura com mais espaços, melhorar a urbanização do entorno, com acréscimo de estacionamento, e complementação do muro do Campus e o tratamento da drenagem da área.
----------------------------	------------------------	--

Fonte: Coordenadoria de Projetos/PREUNI, 2021.

3. Desfazimento de ativos

a) Formas de desfazimentos de ativos

Tabela 3. Desfazimento de bens.

Formas ¹²	Quantidade de Processos Concluídos	Valor ¹³ (R\$)
Doações	0	0
Transferências Externas	0	0
Alienações	0	0
Total	0	0

Fonte: PREUNI, 2021.

¹² Decreto 99.658/90; Decreto 9.373/18

¹³ Equivale ao valor contábil

b) Principais itens e Instituições Beneficiadas

Não houve.

4. Locação de equipamentos

a) Locação de Equipamentos

Quadro 10. Contrato de locação de equipamentos em 2020.

Contrato	Tipos	Local	Valor ¹⁴ (R\$)
28/2018	Serviço de outsourcing de impressão (Plotter 36)	SG-07-PREUNI	23.340,96
	Total		23.340,96

Fonte: Coordenadoria de Projetos/PREUNI, 200.

¹⁴ Equivale ao valor pago dentro do exercício de referência do relatório.

b) Principais tipos de locação de equipamentos e justificativa

PLOTTER 36 - A Prefeitura Universitária-UFPI demanda diversos tipos de plantas para execução de serviços gráficos especiais que atendem às atividades ordinárias de suas coordenadorias, no exercício do planejamento, do controle de obras, projetos e manutenção. Além disso, órgãos como o Corpo de Bombeiros ainda demandam as plantas impressas (3 vias) para a aprovação. Essas peças gráficas são produzidas em tamanhos e formatos específicos variando do A3 ao A0, podendo ainda ser a plotagem em preto e branco e plotagem colorida. Tais serviços são executados por máquinas especiais e são equipamentos de aquisição e manutenção onerosa.

5. Mudanças e desmobilização relevantes

Não houve.

6. Principais desafios e ações futuras

1. Promover acessibilidade nas edificações da UFPI;
2. Adaptar as edificações existentes de acordo com as normas vigentes do Corpo de Bombeiros;
3. Elaborar projetos com reaproveitamento de energias sustentáveis;
4. Regularizar certidões dos terrenos da UFPI;
5. Prover melhorias no sistema de drenagem e coleta de esgoto;
6. Realizar melhorias do sistema de iluminação pública; e
7. Prover manutenção das edificações existentes.

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

1. Critérios de sustentabilidade nas contratações

Os critérios de sustentabilidade nas contratações de prestações de serviços estão previstos em editais de licitação e são baseados no:

- Decreto 5.975/2006;
- Lei 6.938/1981;
- Portaria MMA nº 253, de 18 de agosto de 2006;
- Instrução Normativa IBAMA Nº 5 DE 20/03/2014;
- Resolução CONAMA Nº 307, DE 5 DE JULHO DE 2002;
- Instrução Normativa SLTI/MPOG nº01/2010;
- Resolução CONAMA Nº 382, de 26/12/2006;
- Resolução CONAMA N.º 001 de 08 de março de 1990; e
- Plano de Logística Sustentável – PLS 2018-2020 da UFPI.

2. Ações para redução de utilização de recursos naturais no âmbito da PREUNI

a) Ações para redução do consumo de recursos naturais

São requisitos para a elaboração dos projetos, além de outros pertinentes:

- Promoção da qualidade ambiental externa e interna;
- Utilização de materiais e sistemas que possuam durabilidade;
- Uso de soluções, materiais e sistemas de fácil manutenção;
- Uso de equipamentos de climatização mecânica, ou de novas tecnologias de resfriamento do ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispensável;
- Automação da iluminação do prédio, projeto de iluminação, interruptores, iluminação ambiental, iluminação tarefa, uso de sensores de presença;
- Uso exclusivo de lâmpadas LED, fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de luminárias eficientes;
- Energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de água;
- Sistema de reuso de água e de tratamento de efluentes gerados;

- Aproveitamento da água da chuva, agregando ao sistema hidráulico elementos que possibilitem a captação, transporte, armazenamento e seu aproveitamento.
- Utilização de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradáveis, e que reduzam a necessidade de manutenção;
- Possibilidade de emprego de materiais, tecnologia e matérias-primas existentes no local para execução, de modo a diminuir os custos de transporte;
- Facilidade e economia na execução, conservação e operação, sem prejuízo da durabilidade da obra ou serviço;
- Adoção das normas técnicas de saúde e de segurança do trabalho adequadas;
- Acessibilidade; e
- Economia da manutenção e operacionalização da edificação, redução do consumo de energia e água, bem como a utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

Abaixo, segue o consumo de energia elétrica e água:

Tabela 4. Consumo de energia elétrica e água em 2020.

Consumo	2018	2019	2020
Energia elétrica (consumo em Kwh)	20.231.879,00	20.241.198,00	12.833044,00
Água (consumo em m³)	2.548,00	213,69	156,62

Fonte: Coordenadoria de Manutenção Patrimonial/PREUNI, 2020.

3. Ações para redução de resíduos de poluentes

Foi realizado o levantamento de demandas de forma parcial, entre elas a necessidade de regularizar a coleta de resíduos comuns, especiais e recicláveis da UFPI. Abaixo os contratos geridos e seus respectivos objetos:

1. Contrato nº 66/2019, Empresa RAIZ SOLUÇÕES EM RESÍDUOS, Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UFPI, TERESINA.

<https://ufpi.br/contratos-sustentabilidade-preuni-2>

2. Contrato nº 24/2020, Empresa STERLIX AMBIENTAL PIAUÍ TRATAMENTO DE RESÍDUOS, Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ESPECIAIS, PRODUZIDOS NO CAMPUS DE TERESINA – UFPI

<https://ufpi.br/contratos-sustentabilidade-preuni-2>

3. TERMO DE COMPROMISSO, Empresa COOPERATIVA DE TRABALHO EMPREENDEDOR E CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DO ESTADO DO PIAUÍ - COOTEMARPI, Objeto COLETA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS DESCARTADOS NO CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – UFPI, EM TERESINA, PARA FINS DE RECICLAGEM.
<https://ufpi.br/contratos-sustentabilidade-preuni-2>

ACESSIBILIDADE

1. Descrever os mecanismos para garantir a acessibilidade nas instalações da UFPI.

Compor Comissão para atender a Portaria Interministerial nº 323, de 10 de setembro de 2020 (Ministério de Estado da Economia e do Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos).

COVID 19

1. Descrever quais as medidas foram tomadas para mitigar os efeitos da pandemia de covid-19 no contexto da prefeitura Universitária da UFPI.

Ver Quadro 3 referente as ações realizadas pela PREUNI no âmbito da pandemia de COVID-19.

XII - ANEXOS

ANEXO I - RELAÇÃO DE PROJETOS MOVIMENTADOS EM 2020
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

PROJETOS 2020					
ITEM	LOCAL	CENTRO	PROCESSO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO
1	TERESINA	ADM. SUP.	23111.029733/2020-44	PROJETO BÁSICO DE REFORMA DOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS - CMPP	CONCLUÍDO / LICITADO
1	PARNAÍBA	CAMPUS	23111.074197/2019-88	PROJETO BÁSICO DOS SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS PARA A PÓS GRADUAÇÃO DE PARNAÍBA	CONCLUÍDO / LICITADO
1	TERESINA	ADM. SUP.	23111.026680/2020-25	TROCA COBERTURA CENTRO DE CONVIVÊNCIA	CONCLUÍDO / LICITADO
1	TERESINA	ADM. SUP.	23111.024875/2020-66	GALPÃO ALMOXARIFADO	CONCLUÍDO / LICITADO
1	TERESINA	ADM. SUP.		PROJETO BIOTÉRIO CENTRAL – CONCORRÊNCIA FINEP	CONCLUÍDO
	TERESINA	ADM. SUP.		PROJETO BIOTÉRIO PICOS – CONCORRÊNCIA FINEP	CONCLUÍDO
1	FLORIANO	CAMPUS	23111.050012/2019-79	PROJETO DO NAE FLORIANO	CONCLUÍDO
1	BOM JESUS	CAMPUS	23111.020614/2018-77	COBERTURA DE BAIAS DE CAPRINOS E OVINOS	CONCLUÍDO
1	BOM JESUS	CAMPUS	23111.002294/2019-14	SOLUÇÃO PARA RACHADURAS NA LAJE DO HVU, E REESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DE CIRURGIA	CONCLUÍDO

1	TERESINA	CCE	231111.048523/2019-27	REFORMA NO DEPARTAMENTO DE LETRAS.	CONCLUÍDO
1	TERESINA	CCA	23111.075287/2018-52	MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÕES - REPARO DE INSTALAÇÕES E ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL – NUPCELT	CONCLUÍDO
1	TERESINA	ADM. SUP.	23111.030553/2020-20	ADESÃO DE SOFTWARE ESTRUTURAL	CONCLUÍDO
1	TERESINA	ADM. SUP.		ADESÃO DE SOFTWARE COMPLEMENTARES	CONCLUÍDO
1	TODOS OS CAMPI	ADM. SUP.		QUANTIFICAÇÃO DE ARTEFATOS COVID – LAVATÓRIOS, TERMÔMETRO, DISPENSER E IRRADIADOR	CONCLUÍDO
1	TODOS OS CAMPI	ADM. SUP.		QUANTIFICAÇÃO DE DIVISÓRIAS ACRÍLICAS	CONCLUÍDO
1	TERESINA	CCS		ADAPTAÇÃO EMERGENCIAL ENGATE CLÍNICA	CONCLUÍDO
1	TERESINA	ADM SUP		ADAPTAÇÕES DO ANTIGO DMOR PARA A PREX	CONCLUÍDO
1	TERESINA	ADM SUP		REFORMA CAC PARA FADEX	CONCLUÍDO
1	TERESINA	ADM. SUP.	23111.064917/2019-97	PROJETO DE ACESSIBILIDADE DA BIBLIOTECA	EM ANDAMENTO / FALTA ESTIMATIVA
1	BOM JESUS	CAMPUS		PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO HVU	EM ANDAMENTO /FALTA ORÇAMENTO
1	TERESINA	CCHL	053170/2018-79	REFORMULAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO CCHL	EM ANDAMENTO

1	TERESINA	CCN	034421/2018-59	CONSTRUÇÃO DE NOVOS GABINETES DE PROFESSORES	EM ANDAMENTO / FALTA ESTIMATIVA
1	TERESINA	CCN	023943/2019-13	PROJETO DE ÁREA LÚDICA NO CCN II	EM ANDAMENTO
1	TERESINA	CCS	008793/2016-29	AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE FARMÁCIA	EM ANDAMENTO / FALTA ESTIMATIVA
1	TERESINA	CCS	024997/2016-15	AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO SG-10	EM ANDAMENTO
1	TERESINA	CCN	0345952018-17	REFORMA DO TROPEN	EM ANDAMENTO / FALTA ORÇAMENTO
1	TERESINA	ADM. SUP.	008696/2016-36	REFORMA DA RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA ANTIGA	EM ANDAMENTO
1	TERESINA	ADM. SUP	000535/2019-74	CERCADO NA ÁREA DO ALMOXARIFADO	EM ANDAMENTO / FALTA ESTIMATIVA
1	TERESINA	ADM. SUP	065424/2019-85	ADEQUAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO DO ALMOXARIFADO	EM ANDAMENTO
1	TERESINA	ADM SUP	036298/2019-11	ADEQUAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO DO LIB	EM ANDAMENTO / 2ª ANÁLISE BOMBEIROS
1	TERESINA	ADM SUP	063851/2019-70	ADEQUAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO DO PRÉDIO ATUAL DO CEAD	EM ANDAMENTO / FALTA ESTIMATIVA
1	TERESINA	ADM SUP	073956/2019-96	PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	EM ANDAMENTO / ANÁLISE BOMBEIROS / CORREÇÕES
1	PICOS	ADM SUP	068964/2018-53	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA DTI	EM ANDAMENTO
1	TERESINA	ADM. SUP.	23111.039948/2020-10	REFORMA ENGATES PARA AUDITORIA, SIC, OUVIDORIA, ASSESSORIA	EM ANDAMENTO

1	TERESINA	CCN	23111.031980/2020-97	SOLICITANDO VISTORIA DO PRÉDIO LAGO - ADEQUAÇÃO ÀS REGRAS DO CORPO DE BOMBEIROS.	EM ANDAMENTO
1	TERESINA	CCN	23111.031979/2020-27	SOLICITA VISTORIA DO PRÉDIO LAPETRO - ADEQUAÇÃO ÀS REGRAS DO CORPO DE BOMBEIROS E ATUALIZAÇÃO DA PLANTA ESTRUTURAL.	EM ANDAMENTO
1	TERESINA	CCN	23111.031980/2020-97	SOLICITA VISTORIA PRÉDIO ZOOLOGIA - ADEQUAÇÃO ÀS REGRAS DO CORPO DE BOMBEIROS - AVALIAÇÃO DE RISCOS DE INCÊNDIO NO DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA.	EM ANDAMENTO
1	TERESINA	CCN	23111.039533/2020-60	VISTORIA PRÉDIO MASP - ADEQUAÇÃO ÀS REGRAS DO CORPO DE BOMBEIROS.	EM ANDAMENTO
1	TERESINA	ADM. SUP.		LAUDO DE ACESSIBILIDADE E ADAPTAÇÕES DE ACESSIBILIDADE – CENTRO DE CONVIVÊNCIA	EM ANDAMENTO
1	TERESINA	CCS	025472/2020-49	SG-10	EM ANDAMENTO
1				SG-05	EM ANDAMENTO
1				ENGATE CLÍNICA	EM ANDAMENTO
1				RADIOLOGIA	EM ANDAMENTO
1				CME	EM ANDAMENTO
TOTAL DE PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO – 2020					26
TOTAL DE PROJETOS BÁSICOS CONCLUÍDOS EM 2020					17

Fonte: Coordenadoria de Projetos/PREUNI, 2020.

**ANEXO II - ATIVIDADES COMPLEMENTARES EM 2020
COORDENAÇÃO DE PROJETOS**

ITEM	TIPO	DISCRIMINAÇÃO	Nº DE SERVIDORES
1	PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO	COMISSÃO DE ELABORAÇÃO DO PDU DA UNIDADE – 2020-2022	3
2	PARTICIPAÇÃO EM CURSO	INTRODUÇÃO À GESTÃO DE PROCESSOS	5
		INTRODUÇÃO À GESTÃO DE PROJETOS	6
		PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS	5
		CURSO DE ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETO BÁSICO PARA A CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1
		SEMINARIO RDC - APLICAÇÃO DO RDC E DA CONTRATAÇÃO INTEGRADA NA LICITAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	1
		CURSO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – CONTEXTO COVID	6
3	TREINAMENTO EM SOFTWARE DE ENGENHARIA	QI BUILDER ELÉTRICA	2
		QI BUILDER HIDROSSANITÁRIA	3
		QI BUILDER INCÊNDIO	4
4	FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO	FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE PLOTAGEM	1

Fonte: Coordenadoria de Projetos/PREUNI, 2020.

**ANEXO III - TOTAL GASTO COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART/RRT) EM 2020
COORDENAÇÃO DE PROJETOS**

ART'S E RRT'S DA CP				
2020				
ITEM	TIPO	DISCRIMINAÇÃO	QUANIDADE	VALOR PAGO
1	ART	ART'S DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CREA	19	R\$ 1.686,82
2	RRT	RRT'S DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ARQUITETURA - CAU	9	R\$ 881,55
3	RRT EXTEMPORÂNEA	RRT'S EXTEMPORÂNEAS DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ARQUITETURA - REGULARIZAÇÃO	0	R\$ 0,00
TOTAL GASTO EM REGISTROS DE SERVIÇOS E PROJETOS EM 2020				R\$ 2.568,37
2019				
1	ART	ART'S DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CREA	33	R\$ 2.836,68
2	RRT	RRT'S DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ARQUITETURA - CAU	15	R\$ 1.421,40
3	RRT EXTEMPORÂNEA	RRT'S EXTEMPORÂNEAS DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ARQUITETURA - REGULARIZAÇÃO	0	R\$ 0,00
TOTAL GASTO EM REGISTROS DE SERVIÇOS E PROJETOS EM 2019				R\$ 4.258,08
2018				
1	ART	ART'S DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CREA	11	R\$ 912,34
2	RRT	RRT'S DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ARQUITETURA - CAU	33	R\$ 3.019,50
3	RRT EXTEMPORÂNEA	RRT'S EXTEMPORÂNEAS DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ARQUITETURA - REGULARIZAÇÃO	13	R\$ 4.758,00
TOTAL GASTO EM REGISTROS DE SERVIÇOS E PROJETOS EM 2018				R\$ 8.689,84

Fonte: Coordenadoria de Projetos/PREUNI, 2020.

ART'S E RRT'S DA CP – 2020						
ITEM	TIPO	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	SERVIDOR	DATA	VALOR PAGO
1	ART	PROJETO	PROJETO ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO – CENTRO DE CONVIVÊNCIA	LEOPOLDO ASSIS OLIVEIRA	02/06/20	R\$ 88,78
2	ART	PROJETO	ORÇAMENTO – CENTRO DE CONVIVÊNCIA	RAFAEL DE SOUSA LEAL MARTINS MOURA	02/06/20	R\$ 88,78
3	ART	PROJETO	PROJETO DE DRENAGEM, FORRO E PASSARELA DE SEGURANÇA – CENTRO DE CONVIVÊNCIA	MARCO ANTONIO MASTRANGELO	30/06/20	R\$ 88,78
4	ART	PROJETO	ORÇAMENTO – BIOTÉRIO PICOS	RAFAEL DE SOUSA LEAL MARTINS MOURA	02/09/20	R\$ 88,78
5	ART	PROJETO	ORÇAMENTO – BIOTÉRIO CENTRAL	RAFAEL DE SOUSA LEAL MARTINS MOURA	02/09/20	R\$ 88,78
6	ART	PROJETO	PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO – CINTEG-BIOC (LIB)	FERNANDO HIPÓLITO BARROS TRINDADE DA SILVA	02/09/20	R\$ 88,78
7	ART	PROJETO	PROJETO DE SPDA – CINTEG-BIOC (LIB)	LEOPOLDO ASSIS OLIVEIRA	02/09/20	R\$ 88,78
8	ART	PROJETO	ORÇAMENTO – GALPÃO ALMOXARIFADO ANEXO II	RAFAEL DE SOUSA LEAL MARTINS MOURA	12/05/20	R\$ 88,78
9	ART	PROJETO	PROJETO ESTRUTURAL – GALPÃO ALMOXARIFADO ANEXO II	MARCO ANTONIO MASTRANGELO	30/06/20	R\$ 88,78

10	ART	PROJETO	PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO – GALPÃO ALMOXARIFADO ANEXO II	MARCO ANTONIO MASTRANGELO	30/06/20	R\$ 88,78
11	ART	PROJETO	PROJETO ELÉTRICO E DE SPDA – GALPÃO ALMOXARIFADO ANEXO II	LEOPOLDO ASSIS OLIVEIRA	12/05/20	R\$ 88,78
12	ART	PROJETO	PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO – HVU BOM JESUS	FERNANDO HIPÓLITO BARROS TRINDADE DA SILVA	31/03/20	R\$ 88,78
13	ART	PROJETO	PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO – REFORMA E AMPLIAÇÃO RU CENTRAL	RAFAEL DE SOUSA LEAL MARTINS MOURA	23/07/20	R\$ 88,78
14	ART	PROJETO	PROJETO ELÉTRICO E DE SPDA – REFORMA E AMPLIAÇÃO RU III	LEOPOLDO ASSIS OLIVEIRA	02/09/20	R\$ 88,78
15	ART	PROJETO	PROJETO ELÉTRICO E DE SPDA – REFORMA E AMPLIAÇÃO RU CENTRAL	LEOPOLDO ASSIS OLIVEIRA	02/09/20	R\$ 88,78
16	ART	PROJETO	PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO, INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E ORÇAMENTO - REFORMA E AMPLIAÇÃO RU III	FERNANDO HIPÓLITO BARROS TRINDADE DA SILVA	29/07/20	R\$ 88,78
17	ART	PROJETO	PROJETO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E ORÇAMENTO - REFORMA E AMPLIAÇÃO RU CENTRAL	FERNANDO HIPÓLITO BARROS TRINDADE DA SILVA	29/07/20	R\$ 88,78
18	ART	PROJETO	ORÇAMENTO – POS GRADUAÇÃO PARNAÍBA	RAFAEL DE SOUSA LEAL MARTINS MOURA	09/04/20	R\$ 88,78
19	ART	CARGO E FUNÇÃO	DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇÃO	CARLOS DAMON FEITOSA GOMES SOBRINHO	19/11/20	R\$ 88,78

TOTAL GASTO COM ART'S	R\$ 1.686,82
------------------------------	---------------------

Fonte: Coordenadoria de Projetos/PREUNI, 2020.

ITEM	TIPO	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	SERVIDOR	DATA	VALOR PAGO
1	RRT	RRT'S DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ARQUITETURA - CAU	PROJETO DE ARQUITETURA – GALPÃO DO ALMOXARIFADO ANEXO II	ÉRICA CECÍLIA DE SOUSA SOARES	12/05/20	R\$ 97,95
2	RRT	RRT'S DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ARQUITETURA - CAU	PROJETO DE ADAPTAÇÃO ARQUITETONICA PARA AS INSTALAÇÕES DO COMBATE A INCENDIO – HVU BOM JESUS	ÉRICA CECÍLIA DE SOUSA SOARES	31/03/20	R\$ 97,95
3	RRT	RRT'S DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ARQUITETURA - CAU	PROJETO DE ARQUITETURA DO NAE – FLORIANO	ISIS MEIRELES RODRIGUES	07/04/20	R\$ 97,95
4	RRT	RRT'S DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ARQUITETURA - CAU	PROJETO DE REFORMA DA CASA DO ESTUDANTE	EVANDRO CRONEMBERGER BRITO	20/03/20	R\$ 97,95
5	RRT	RRT'S DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ARQUITETURA - CAU	PROJETO DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DOS ENGATES SG08-SG-09 – AUDITORIA	GEOVANA ALVES ROCHA VIEIRA	13/10/20	R\$ 97,95
6	RRT	RRT'S DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ARQUITETURA - CAU	PROJETO ODONTOLOGIA – SG05, ENGATE CLÍNICA CIRÚRGICA E RADIOLOGIA	MARINA FREIRE MIRANDA	13/10/20	R\$ 97,95

7	RRT	CARGO E FUNÇÃO	DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇÃO	ILANA MARIA DE MOURA SOUSA	08/10/20	R\$ 97,95
8	RRT	CARGO E FUNÇÃO	DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇÃO	AUGUSTO DOS SANTOS BRAGANÇA NETO	08/10/20	R\$ 97,95
9	RRT	RRT'S DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ARQUITETURA - CAU	PROJETO ODONTOLOGIA – SG10 e CENTRAL DE MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	EVANDRO CRONEMBERGER BRITO	30/12/20	R\$ 97,95
TOTAL GASTO COM RRT'S						R\$ 881,55

Fonte: Coordenadoria de Projetos/PREUNI, 2020.

ANEXO IV – LICITAÇÕES CONCLUÍDAS EM 2020
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – CLOS

Modalidade	Processo	Descrição da obra	Valor	Empresa vencedora
Convite 01/2020	23111.02805 6/2016-42	Reforma e Ampliação da Clínica de Grandes Animais, no Centro de Ciências Agrárias, no Campus Ministro Petrônio Portella, em Teresina-PI	R\$ 215.182,74	CONSTRUTORA JM EXCELENCIA EIRELI
RDC 01/2020	23111.07419 7/2019-88	Complementação de Serviços na Obra da Pós-Graduação de Parnaíba no Campus da Universidade Federal do Delta do Parnaíba – UFDPAR, em Parnaíba, Piauí	R\$ 92.148,60	CONSTRUTORA J M EXCELENCIA EIRELI
RDC 02/2020	23111.02668 0/2020-25	Reforma do Centro de Convivência para adequação do Sistema de Combate a Incêndio e Pânico – 1ª etapa, da Universidade Federal do Piauí, em Teresina, Piauí	R\$ 2.068.633,14	VERTICAL - ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA
RDC 03/2020	23111.02487 5/2020-66	Obra do Galpão do Almoxarifado – Anexo II do Campus Ministro Petrônio Portella, em Teresina, Piauí	R\$ 489.605,33	R. GUIMARÃES DA SILVA CONSTRUÇÕES
RDC 04/2020	23111.02973 3/2020-44	Reforma e Ampliação dos Restaurantes Universitários, Unidades Central e III, no Campus Ministro Petrônio Portella, em Teresina, Piauí	R\$ 2.034.657,55	EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS EIRELI

**ANEXO V – OBRAS EM ANDAMENTO EM 2020
COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS**

OBRAS EM ANDAMENTO EM 2020								
ITEM	MODALIDADE	DISCRIMINAÇÃO	EMPRESA	INÍCIO	FIM	VALOR TOTAL (R\$)	SITUAÇÃO	MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL
CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELA								
1	TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2018 23111.023827/2017-96	Prédio do Centro de Ciências Agrárias no Campus Ministro Petrônio Portella, em Teresina, Piauí	R. GUIMARAES	03/06/2019	21/02/2021	1.947.642,47	EM ANDAMENTO	1.334.337,52
2	CONVITE Nº 01/2020 23111.028056/2016-42	Reforma e Ampliação da Clínica de Grandes Animais, no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Piauí, Campus Ministro Petrônio Portella, em Teresina PI	CONSTRUTORA JM EXCELENCIA	20/07/2020	16/01/2021	215.182,74	EM ANDAMENTO	172.146,19

3	RDC 03/2018/IFSULDEMI NAS 23111.082714/2019- 19	Usinas de Placas Fotovoltaicas	GS CONSTRUÇÕES	30/01/2020	23/05/2021	2.207.352,00	EM ANDAMENTO	1.042.090,87
4	RDC 02/2020 CONTRATO 03/2021 23111.026680/2020- 25	Reforma do Centro de Convivência para Adaptação do Sistema de Combate a Incêndio e Pânico	VERTICAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E EMPREENHIMENT OS LTDA	22/01/2021	21/07/2021	2.068.633,14	INICIADO	-
5	RDC 03/2020 CONTRATO 01/2021 23111.024875/2020- 66	Obra do Galpão do Almoxarifado – Anexo II do Campus Ministro Petrônio Portella, em Teresina, Piauí	R. Guimarães da Silva Construções	20/01/2021	21/03/2021	489.605,34	INICIADO	
6	RDC 04/2020 CONTRATO 02/2021 23111.029733/2020- 44	Reforma e Ampliação dos Restaurantes Universitários, Unidades Central e III, no Campus Ministro Petrônio Portella, em Teresina, Piauí	EMPRESA EXECUTAR ENERGIA E SERVICOS EIRELI	21/01/2021	17/11/2021	2.034.657,56	INICIADO	
6	TOTAIS					8.963.073,25		2.548.574,58
CAMPUS HELVÍDIO NUNES DE BARROS								

1	TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2018 23111.022655/2017-33	Obra do prédio Núcleo de Assistência Estudantil – NAE, no Campus Senador Helvidio Nunes de Barros, em Picos, Piauí	MARATHOAN	31/7/2019	22/12/2020	616.163,45	EM ANDAMENTO	523.738,93
2	TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019 23111.069087/2018-30	Construção do Prédio do curso de medicina, ampliação do bloco existente, urbanização e complementação da drenagem e do muro do campus, no Campus de Picos, Picos/PI	R.GUIMARAES	2/1/2020	25/2/2021	1.663.336,25	EM ANDAMENTO #APROVAÇÃO ADITIVO VALOR E PRAZO	757.140,85
2	TOTAIS					2.279.499,70		1.280.879,78
8						11.242.572,95		3.829.454,36

Fonte: Coordenadoria de Obras/PREUNI, 2020.

**ANEXO VI – NÚMERO DE ATENDIMENTOS DE MANUTENÇÃO ATENDIDOS EM 2020
COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013-2020
1	MANUTENÇÃO ELÉTRICA E INFRAESTRUTURA	-	251	1356	1337	411	472	505	184	4.516
2	MANUTENÇÃO PREDIAL	278	259	2177	3063	3543	2417	1400	253	13.390
TOTAL		278	510	3533	4400	3954	2889	1905	437	17.906
		1,55%	2,85%	19,73%	24,57%	22,08%	16,13%	10,64%	2,44%	100,00%

2014	Nº	2015	Nº	2016	Nº	2017	Nº	2018	Nº	2019	Nº	2020	Nº
INFRAESTRUTURA													
JAN	251	JAN	126	JAN	164	JAN	56	JAN	44	JAN	36	JAN	28
FEV		FEV	101	FEV	210	FEV	52	FEV	42	FEV	49	FEV	35
MAR		MAR	256	MAR	129	MAR	56	MAR	53	MAR	61	MAR	42
ABR		ABR	111	ABR	111	ABR	46	ABR	60	ABR	72	ABR	0
MAI		MAI	148	MAI	164	MAI	63	MAI	26	MAI	61	MAI	0
JUN		JUN	-	JUN	-	JUN	-	JUN	25	JUN	44	JUN	0
JUL		JUL	107	JUL	130	JUL	26	JUL	36	JUL	37	JUL	5

AGO		AGO	114	AGO	84	AGO	23	AGO	47	AGO	46	AGO	12
SET		SET	98	SET	59	SET	31	SET	39	SET	15	SET	13
OUT		OUT	70	OUT	102	OUT	26	OUT	37	OUT	42	OUT	9
NOV		NOV	131	NOV	88	NOV	26	NOV	34	NOV	34	NOV	21
DEZ		DEZ	94	DEZ	96	DEZ	6	DEZ	29	DEZ	8	DEZ	19
TOTAL	251	TOTAL	1356	TOTAL	1337	TOTAL	411	TOTAL	472	TOTAL	505	TOTAL	184
2014	Nº	2015	Nº	2016	Nº	2017	Nº	2018	Nº	2019	Nº	2020	Nº
PREDIAL													
JAN	90	JAN	174	JAN	261	JAN	307	JAN	303	JAN	99	JAN	61
FEV	56	FEV	206	FEV	264	FEV	280	FEV	245	FEV	74	FEV	50
MAR	113	MAR	273	MAR	179	MAR	320	MAR	413	MAR	108	MAR	32
ABR		ABR	197	ABR	269	ABR	275	ABR	313	ABR	115	ABR	0
MAI		MAI	108	MAI	194	MAI	267	MAI	159	MAI	133	MAI	0
JUN		JUN	112	JUN	236	JUN	279	JUN	103	JUN	258	JUN	2
JUL		JUL	192	JUL	263	JUL	298	JUL	57	JUL	117	JUL	10
AGO		AGO	255	AGO	297	AGO	357	AGO	167	AGO	92	AGO	5
SET		SET	208	SET	288	SET	282	SET	311	SET	141	SET	20
OUT		OUT	162	OUT	318	OUT	308	OUT	109	OUT	101	OUT	12
NOV		NOV	126	NOV	249	NOV	305	NOV	152	NOV	76	NOV	22
DEZ		DEZ	164	DEZ	245	DEZ	265	DEZ	85	DEZ	86	DEZ	39

TOTAL	259	TOTAL	2177	TOTAL	3063	TOTAL	3543	TOTAL	2417	TOTAL	1400	TOTAL	253
TOTAL 2014	510	TOTAL 2015	3533	TOTAL 2016	4400	TOTAL 2017	3954	TOTAL 2018	2889	TOTAL 2019	1905	TOTAL 2020	437

Fonte: Coordenadoria de Manutenção Patrimonial/PREUNI, 2020.

ANEXO VII – SERVIÇOS E CONTRATOS DE MANUTENÇÃO GERIDOS EM 2020
COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL

Nº do Contrato	Fornecedor	Descrição dos serviços
100/2012	AGESPISA ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO.
42/2017	TOP AR-CONDICIONADO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, BEBEDOUROS E OUTROS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS A SEREM EXECUTADOS EM TERESINA-PI.
002/2018	ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S/A	FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E/OU DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DESTINADO A ATENDER AOS PRÉDIO DA CONTRATANTE QUE ABRIGAM A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, NO MUNICÍPIO DE TERESINA - PI
009/2018	NOSSA LUZ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELÉTRICA DE ALTA E BAIXA TENSÃO, PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELA, EM TERESINA.
33/2019	TOP AR-CONDICIONADO LTDA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR CAMPUS DE TERESINA
61/2019	MULTIPAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA. CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELA E UNIDADES EXTERNAS (CCS E CEAD) TERESINA -PI
19/2019	EQUATORIAL	FORNECIMENTO DE ENERGIA

Fonte: Coordenadoria de Manutenção Patrimonial/PREUNI, 2020.

**ANEXO VIII – RELAÇÃO DE POSTOS EFETIVOS E TERCEIRIZADOS DE
VIGILÂNCIA NA UFPI EM 2020**

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA

COORDENADORIA DE SERVIÇOS OPERACIONAIS

QUADRO EFETIVO		
POSTO	HORAS	UFPI
BIBLIOTECA	24 HS	05
ROSA DOS VENTOS	24 HS	05
PREX	24 HS	05
CENTRAL	24 HS	05
CEAD (UAPI)	24 HS	05
MONITORAMENTO	24 HS	05
CHEFES DE TURMA	24 HS	05
CHEFIA E SECRETARIA	24 HS	02
FÉRIAS		06
TOTAL	11 POSTOS	43 HOMENS

CONTRATO Nº 16/2020 - EMPRESA CET SEG SEGURANÇA ARMADA LTDA. VIGILÂNCIA ARMADA		
POSTO	HORAS	CETSEG LTDA.
REITORIA	24HS	04
PORTÃO AMARELO (RU I)	24HS	04
ENFERMAGEM	24HS	04
MORFOLOGIA SG 15/16	24HS	04
ALMOXARIFADO CENTRAL	24HS	04
SETOR DE ESPOTES	24HS	04
CCN SG 01 AO SG 03	24HS	04
GARAGEM/GRÁFICA	24 HS	04
BLOCO DE MODAS	24HS	04
CCHL P1	24HS	04
CCE	24HS	04
CENTRO DE TECNOLOGIA (CT)	24HS	04
BADMINTON	24HS	04
CCA/APRISCO	24HS	04
NEPAS	NOTURNO	02
RONDAS MÓVEIS 01	24HS	04
RONDAS MÓVEIS 02	24HS	04
RONDAS MÓVEIS 03 (CCA)	24HS	04
CCA/ZOOTECNIA	24 HS	04
CCA / HVU	24 HS	04
GALPÃO TERESINA SHOPPING	24 HS	04
CTT	NOTURNO	02
TOTAL	22 POSTOS	84 HOMENS

CONTRATO Nº 17/2020 - CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - VIGIAS		
POSTO	HORAS	CETSEG LTDA
TROPEN*	24HS	04
NOÉ MENDES*	24HS	04
CASA DO ESTUDANTE I*	24HS	04
CT/CCN NOVO 12*	24HS	12
CCHL 12*	24HS	12
CCE 12*	24HS	12
BIOLOGIA FUNDO*	24HS	04
NUTRIÇÃO FUNDO*	24 HS	04
SG 10 ODONTOLOGIA*	24HS	04
CEUFPI*	24HS	04
ALOJAMENTO CTT*	24HS	04
CTT*	24HS	04
CCA/NEPAS*	DIURNO	02
CCA /CLÍNICA DE GRANDES ANIM.*	24 HS	04
CCA/ LASO*	NOTURNO	02
FITOTECNIA*	24HS	04
CCS/FREI SERAFIM*(10/07/2020)	24HS	04
INTEGRADO I	24 HS	04
PORTICO*	24 HS	04
CCA/ADM *	24HS	04
GUARITA CENTRAL*	24 HS	04
STI*	24HS	04
CCS NOVO (BIOFÍSICA/FISIOLOGIA) *	24HS	04
TOTAL	27 POSTOS	112 HOMENS

Fonte: Divisão de Vigilância/Coordenadoria de Serviços Operacionais/PREUNI, 2020.

ANEXO IX – BOLETINS DE OCORRÊNCIA EM 2020
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA
COORDENADORIA DE SERVIÇOS OPERACIONAIS

NÚMERO DE BOLETINS DE OCORRÊNCIAS EM 2020			
ITEM	DESCRIÇÃO	2019	2020
1	ASSALTO A MÃO ARMADA	4	-
2	ROUBO DE ARMA DE VIGILANTE	1	-
3	TENTATIVA DE ROUBO DE ARMA DE VIGILANTE	1	-
4	TENTATIVA DE AGRESSÃO ENTRE SERVIDORES / ESTUDANTES	5	-
5	AGRESSÕES A ANIMAIS	2	-
6	VANDALISMO	2	2
7	ACIDENTES VEICULAR	6	-
8	MANIFESTAÇÕES	2	-
9	FURTOS	20	8
10	FESTAS NÃO AUTORIZADAS	8	-
11	INVASÕES	1	-
	PERCA DE BENS DA UFPI	-	1
	TENTATIVA DE ARROMBAMENTO	-	2
TOTAL		52	13

Fonte: Divisão de Vigilância/Coordenadoria de Serviços Operacionais/PREUNI, 2020.

ANEXO X – CONTRATOS REFERENTES A COLETA DE RESÍDUOS
DIVISÃO DE GESTÃO AMBIENTAL
COORDENADORIA DE SERVIÇOS OPERACIONAIS

Nº do Contrato	Fornecedor	Descrição dos serviços
66/2019	RAIZ SOLUÇÕES EM RESÍDUOS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UFPI, TERESINA.
24/2020	STERLIX AMBIENTAL PIAUÍ TRATAMENTO DE RESÍDUOS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ESPECIAIS, PRODUZIDOS NO CAMPUS DE TERESINA - UFPI.
TERMO DE COMPROMISSO	COOPERATIVA DE TRABALHO EMPREENDEDOR E CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DO ESTADO DO PIAUÍ - COOTEMARPI	COLETA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS DESCARTADOS NO CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – UFPI, EM TERESINA, PARA FINS DE RECICLAGEM.

Fonte: Divisão de Gestão Ambiental/Coordenadoria de Serviços Operacionais/PREUNI, 2020.
